



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बन्धौआ रोड फौजी कॉलोनी मसेनी निकट विकास मैरिज लॉन,
फतेहगढ़ फर्रुखाबाद-209601

Email ID- eeupjnrfarrukhabad@gmail.com

पत्रांक 6530 / अ.म. - ०९ / 223 दिनांक 06/10/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:-सोशल मीडिया से प्राप्त खबर "करनदपुर दत्त में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीण स्वच्छ पानी के लिये तरस रहे, कई गांवों को मिलना था शुद्ध पेयजल" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सोशल मीडिया से प्राप्त खबर "करनदपुर दत्त में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीण स्वच्छ पानी के लिये तरस रहे, कई गांवों को मिलना था शुद्ध पेयजल" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम करनपुर दत्त विकासखण्ड-राजेपुर के निर्माण कार्यो को जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-02 के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में योजनान्तर्गत उच्च जलाशय का निर्माण कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है, प्रस्तावित पम्प हाउस 01 नग, बाउन्ड्रीवॉल, ट्यूब बैल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, प्रस्तावित 910 नग गृहसंयोजन के सापेक्ष 135 नग गृहसंयोजन, प्रस्तावित 17225 मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 11578 मी० वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है वर्तमान में पेयजल योजनान्तर्गत घरों में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं अवशेष समस्त कार्यो को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी फर्म मै० जी०वी०पी०आर० द्वारा अपने पत्रांक-GVPR/Farrukhabad/2026-27/369 दिनांक 06.10.2026 के माध्यम से कार्यो को पूर्ण करने का आश्वासन पत्र दिया गया है।

आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जी०वी०आर० इंजी० लि०, फर्रुखाबाद।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बन्धौआ रोड फौजी कॉलोनी मसेनी निकट विकास मैरिज लॉन,
फतेहगढ़ फर्रुखाबाद-209601

Email ID- eeupjnrfarrukhabad@gmail.com

पत्रांक 6530 / चाई - 09 / 223 दिनांक 06/10/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:-सोशल मीडिया से प्राप्त खबर "करनदपुर दत्त में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीण स्वच्छ पानी के लिये तरस रहे, कई गांवों को मिलना था शुद्ध पेयजल" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सोशल मीडिया से प्राप्त खबर "करनदपुर दत्त में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीण स्वच्छ पानी के लिये तरस रहे, कई गांवों को मिलना था शुद्ध पेयजल" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम करनपुर दत्त विकासखण्ड-राजेपुर के निर्माण कार्यो को जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-02 के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में योजनान्तर्गत उच्च जलाशय का निर्माण कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है, प्रस्तावित पम्प हाउस 01 नग, बाउन्ड्रीवॉल, टयूब बैल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, प्रस्तावित 910 नग गृहसंयोजन के सापेक्ष 135 नग गृहसंयोजन, प्रस्तावित 17225 मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 11578 मी० वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है वर्तमान में पेयजल योजनान्तर्गत घरों में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं अवशेष समस्त कार्यो को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी फर्म मै० जी०वी०पी०आर० द्वारा अपने पत्रांक-GVPR/Farrukhabad/2026-27/369 दिनांक 06.10.2026 के माध्यम से कार्यो को पूर्ण करने का आश्वासन पत्र दिया गया है।

आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, फर्रुखाबाद।

अधिशासी अभियन्ता

To,

The Executive Engineer

Division Office UP Jal Nigam (Rural)

Farrukhabad, Uttar Pradesh.

**Subject: Construction of Villages Water Supply Scheme in District Farrukhabad under JJM Phase 2 –
Submission of Work Plan for Karanpur Dutt Water Supply Scheme regd.**

Respected Sir,

With reference to the subject and as per instructions received from your office regarding the Karanpur Dutt Water Supply Scheme, we would like to give you the assurance as follows:

1. That the water supply shall be started within one month through direct pumping from the tubewell.
2. That the pending restoration of roads shall be done in 20 days.
3. The OHT shall be completed by March 2027.
4. And all other pending works will be completed within 4-5 months.

Thanking you and always assuring you of our best services.

Yours sincerely,


For M/s GVPR Engineers Limited


Authorized Signatory *

करनपुर दत्त में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीण स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे, कई गांवों को मिलना था शुद्ध पेयजल

ब्रिजकांतदीक्षित | कुम्हमहरीर(अमृतपुर),
फर्रुखाबाद

23 मिनट पहले

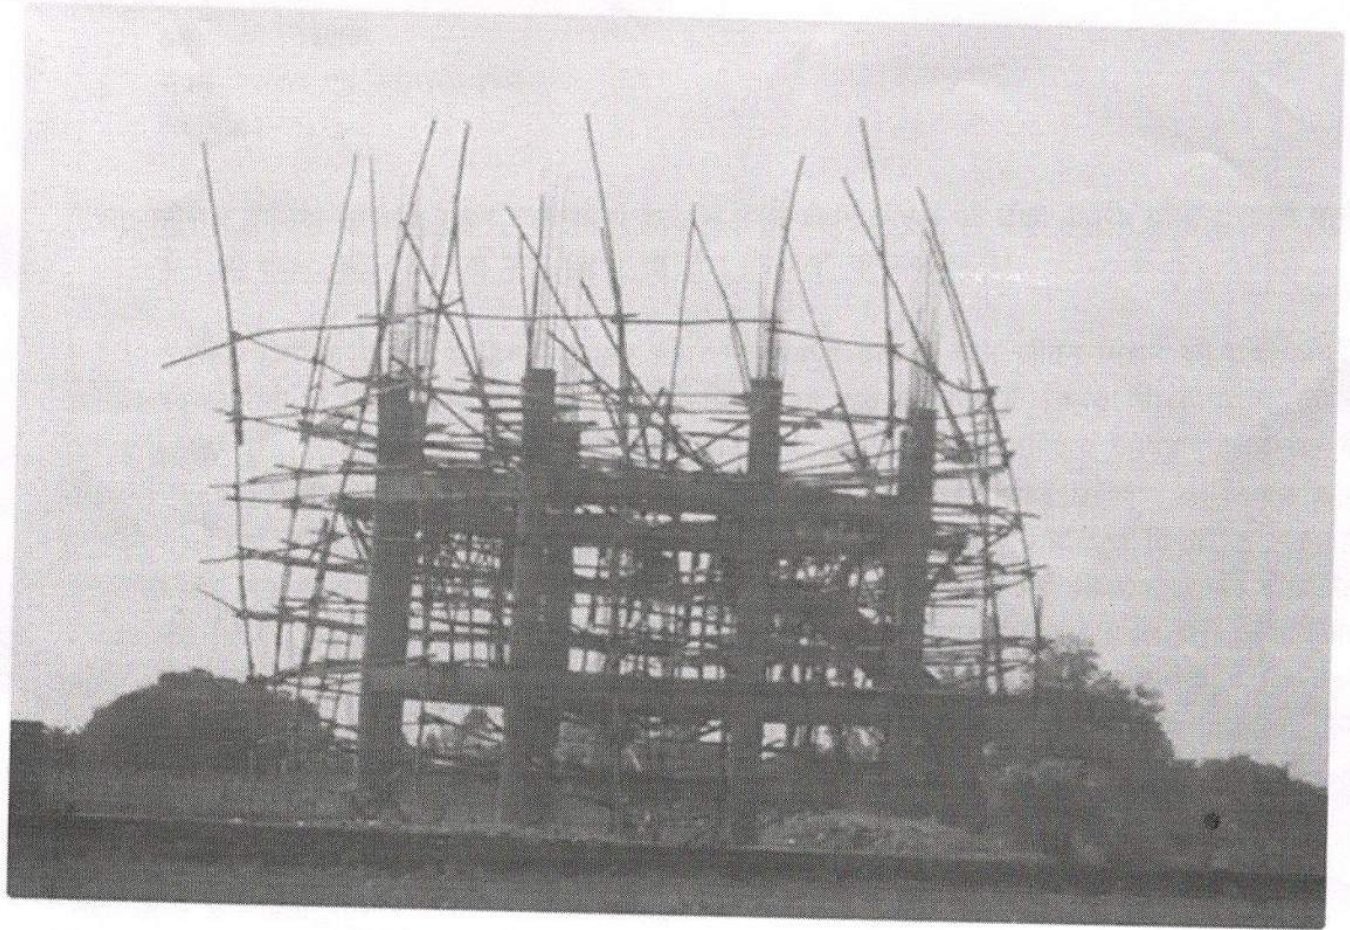

अमृतपुर थाना क्षेत्र के करनपुर दत्त गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी एक साल से अधूरी पड़ी है। इससे आसपास के गांवों के लोग स्वच्छ पेयजल के लिए परेशान हैं। सरकार ने गांव-गांव पानी की टंकियां बनवाने के निर्देश दिए थे। करनपुर दत्त में एक साल पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक सिर्फ बांस-बल्ली ही गाड़े गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काम पूरा नहीं हुआ है। जल निगम के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने इस बारे में जानकारी न होने की बात कही। यह टंकी करनपुर दत्त, मोकुलपुर, निगार, महोलिया, नयागांव, मुजहा और नौ सहारा जैसे गांवों को शुद्ध पानी सप्लाई करने के लिए बन रही थी। इन इलाकों में पानी दूषित पाया गया था।
