



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207



पत्रांक : 02 / कैम्प मंझनपुर / 02 दिनांक : 10.10.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
कौशाम्बी।

विषय— समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन फेल, पांच करोड़ की परियोजना बनी शोपीस" की निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन फेल, पांच करोड़ की परियोजना बनी शोपीस" के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड— सरसवाँ की ग्राम पंचायत— अजरौली में पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसमें 03 ग्राम पंचायतें क्रमशः निखोदा, अजरौली एवं डकशरीरा सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग उच्च जलाशय एवं 18.01 किमी० पाइप व 984 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष नलकूप बोरिंग का कार्य 100 प्रतिशत, पम्प हाउस व बाउण्ड्रीवाल का कार्य 100 प्रतिशत एवं उच्च जलाशय का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कराया जा चुका है तथा 17.54 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 810 नग गृह संयोजन प्रदान किये गये। जिसमें ग्राम— निखोदा में लगभग 225 घरों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ की जा चुकी है। ग्राम— अजरौली में जलापूर्ति किये जाने हेतु बिछायी गयी मुख्य पाइप लाइन को, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज द्वारा रामवन गमन मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जिसके कारण ग्राम— अजरौली में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग प्रयागराज से समन्वय स्थापित कर, रामवन गमन मार्ग को कास कर पुनः पाइप लाइन बिछाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। रामवन गमन मार्ग क्रॉसिंग के उपरान्त मुख्य पाइप लाइन को जोड़कर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। इसी प्रकार ग्राम— डकशरीरा में वर्तमान में पाइप लाइन गैप फीलिंग एवं टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन टेस्टिंग व कमीशनिंग उपरान्त उक्त ग्राम में भी जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। साथ ही साथ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी कुल 9.35 किमी० सड़के/गलियों के सापेक्ष 8.92 किमी सड़के/गलियों को पुनर्स्थापित करा दिया गया है, शेष सड़कों/गलियों को आवगमन हेतु मोटरबुल करा दिया गया है, जिसे पाइप लाइन टेस्टिंग के उपरान्त पूर्व की भाँति पुनर्स्थापित करा दिया जायेगा। विगत लगभग 02 वर्ष से शासन स्तर से धनावंटन प्राप्त न होने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी थी। वर्तमान में सूचीबद्ध एजेन्सी को चेतावनी पत्र निर्गत करते हुये, योजना के निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जा चुका है। योजना के समस्त निर्माण कार्य 31.03.2027 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण करा लिये जायेंगे।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
4. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।

अधिकासी अभियन्ता

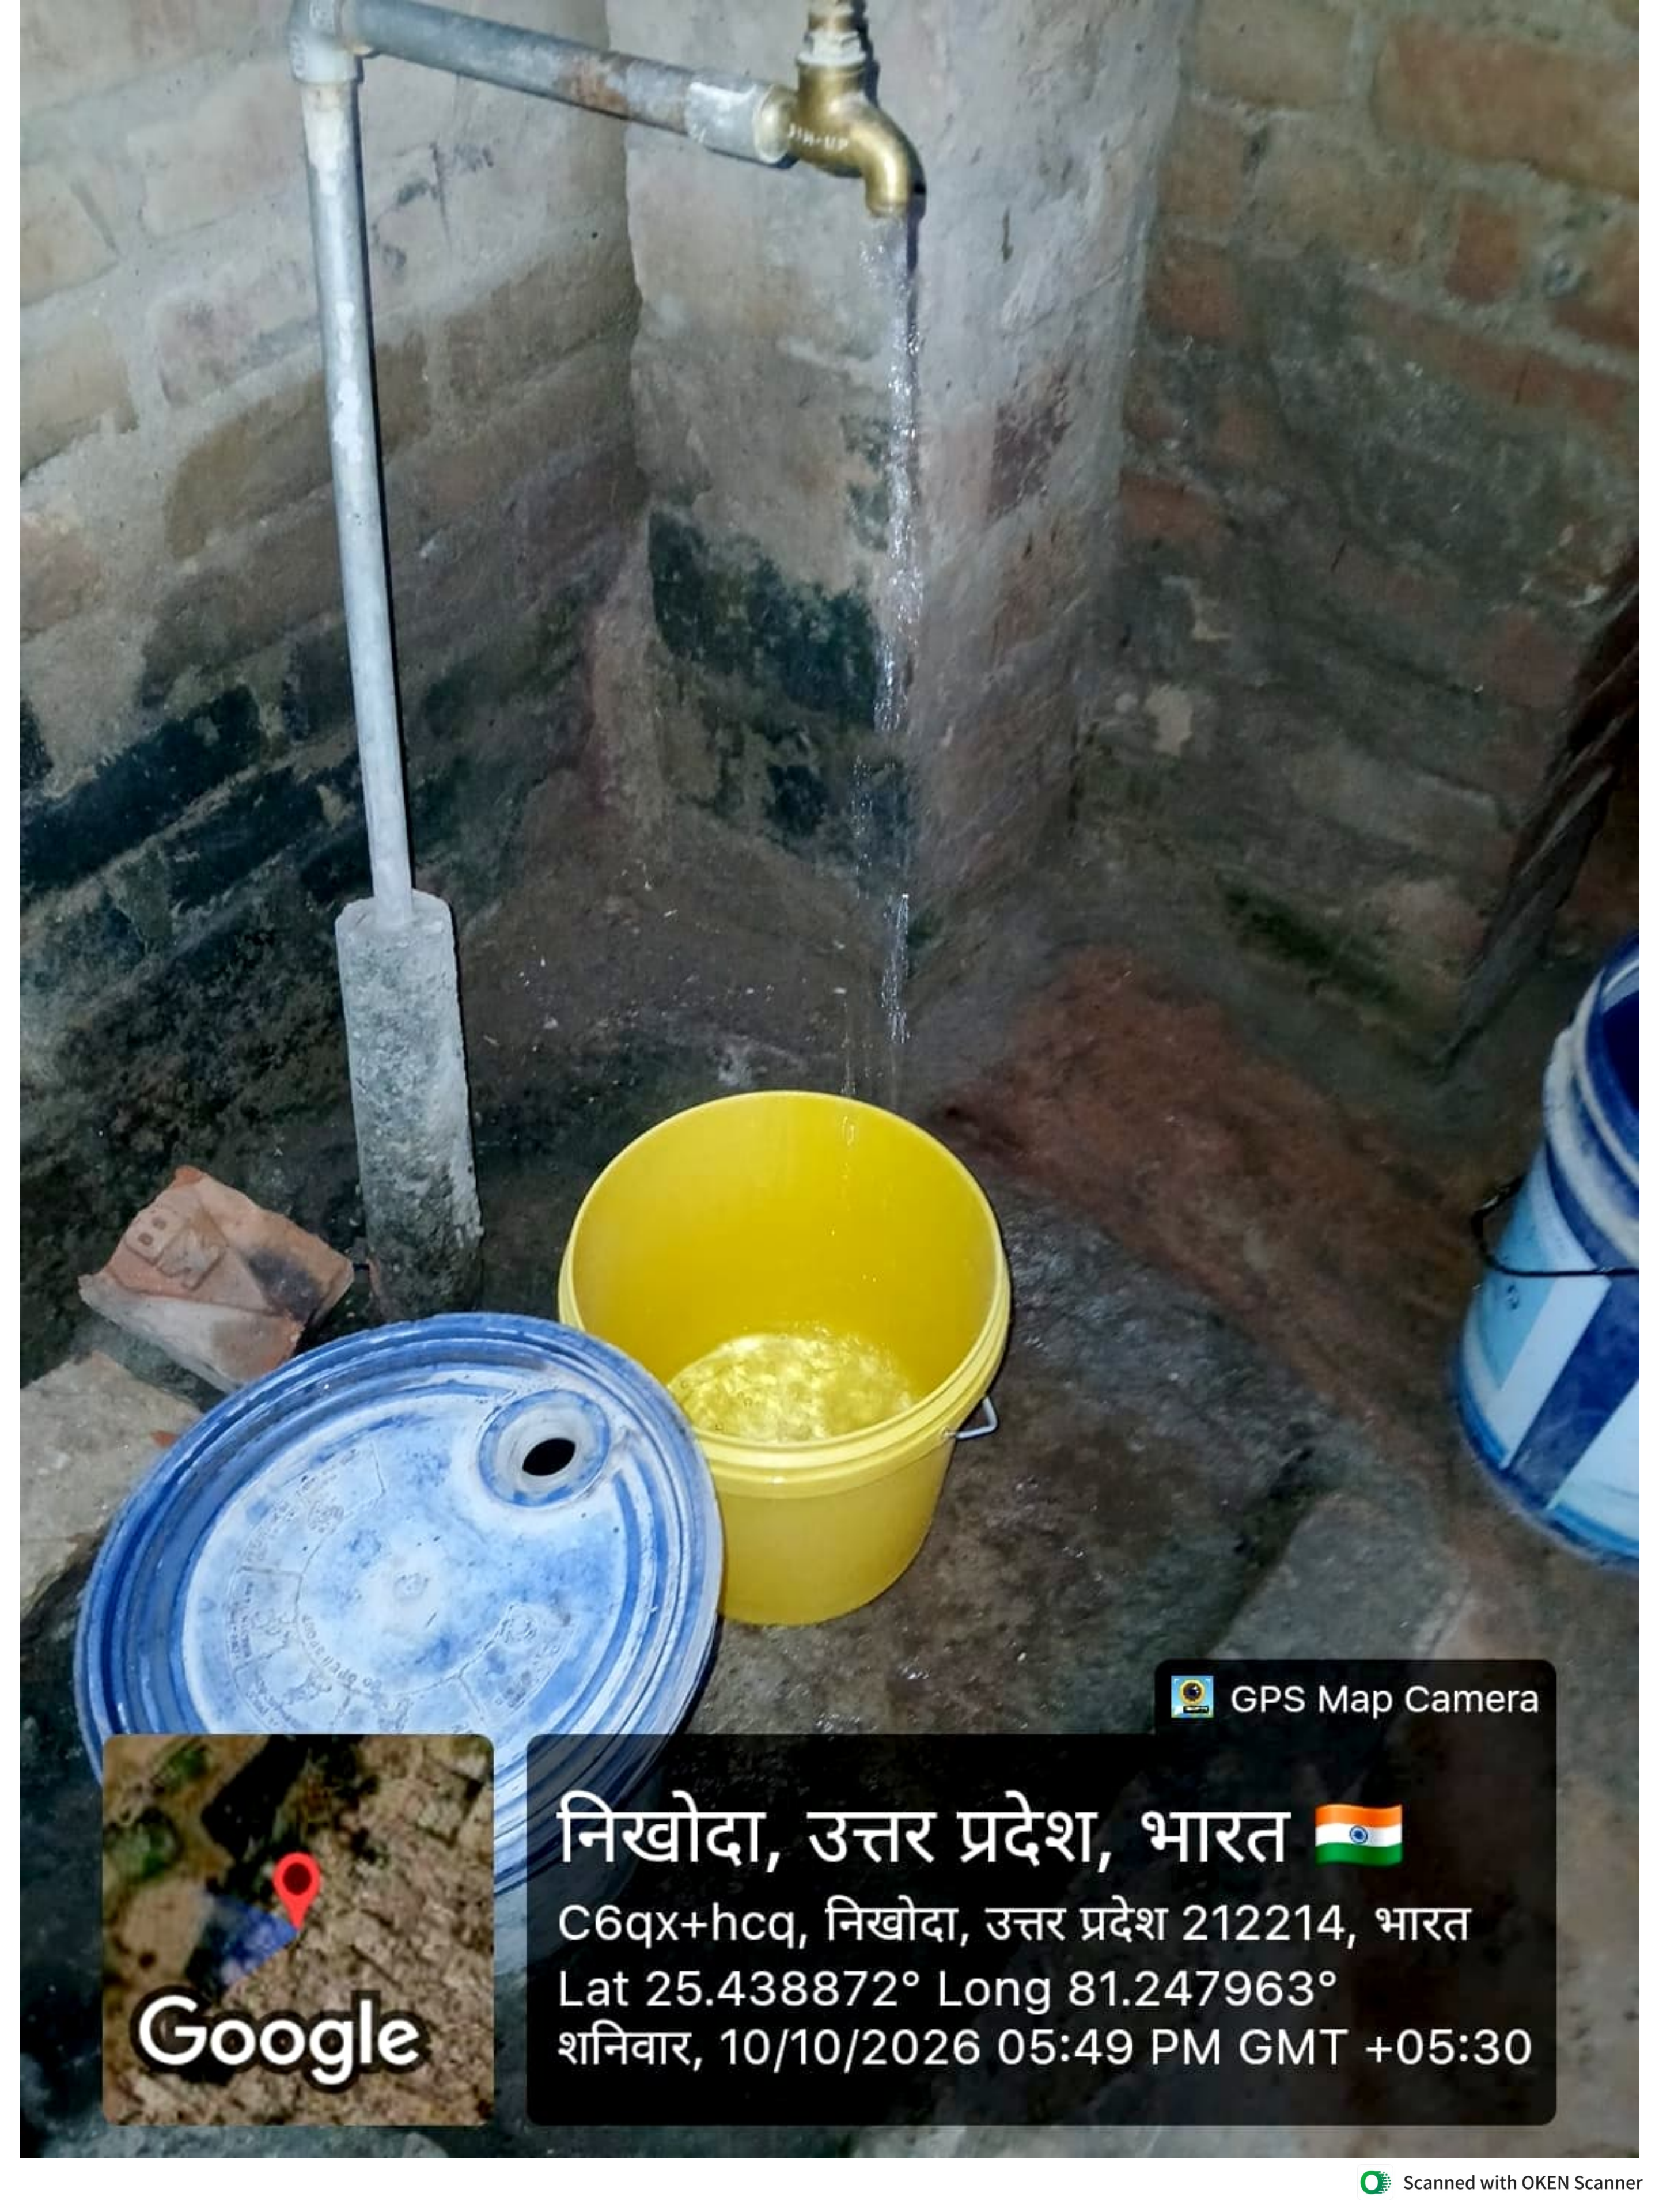

GPS Map Camera



निखोदा, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳

C6qx+hcq, निखोदा, उत्तर प्रदेश 212214, भारत

Lat 25.438872° Long 81.247963°

शनिवार, 10/10/2026 05:49 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera

Ajarouli, Uttar Pradesh, India 

, Ajarouli, Uttar Pradesh 212207, India, Ajarouli,
Uttar Pradesh 212207, India

Lat 25.441711° Long 81.24029°

Tuesday, 06/10/2026 01:19 PM GMT +05:30





Latitude: 25.438230
Longitude: 81.237175
Elevation: 107.45±3.00 m
Accuracy: 3.28 m
Time: 05-10-2026 15:57:33
Note: Gp Ajrauli daksharira

NoteCam @ iOS
