



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

2 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, फील्ड हास्टल, लखनऊ।

दूरभाष- 9532501599 ई-मेल- ee_2cd_lucknow@yahoo.in



पत्रांक: 792 / W.Y 129

दिनांक : 12/10/2026

सेवा में

जिलाधिकारी,

लखनऊ।

विषय- दिनांक 07.10.2026 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर लखनऊ में "मवईकलां में जल जीवन मिशन की पाइप लाइन बनी शोपीस-घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी, राजू मौर्य समेत कई ग्रामीण परेशान" शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।



महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 07.10.2026 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर लखनऊ में "मवईकलां में जल जीवन मिशन की पाइप लाइन बनी शोपीस-घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी, राजू मौर्य समेत कई ग्रामीण परेशान" शीर्षक से खबर प्रकाशित की गयी है के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में 376 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 663 नग राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत कुल 442 नग नलकूप, 442 नग पम्प गृह, 442 नग सोलर प्लान्ट, 381 नग शिरोपरि जलाशय, 442 नग बाउण्ड्रीवॉल, 4940 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 219677 नग पेयजल गृह संयोजन इत्यादि के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 435 नग नलकूप, 435 नग पम्प गृह, 435 नग सोलर प्लान्ट, 214 नग शिरोपरि जलाशय, 4842 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 215314 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा अवशेष कार्य प्रगति पर हैं, योजना में सम्मिलित 663 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 629 नग राजस्व ग्रामों में सीधे पम्पिंग एवं अवर जलाशय के माध्यम से नियमित क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकासखण्ड-मलिहाबाद की मवईकलां ग्राम पंचायत से सम्बन्धित है। प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या निम्नवत् है।

1. मवईकलां ग्राम पेयजल योजना -

विकासखण्ड मलिहाबाद की ग्राम पंचायत मवईकलां पेयजल योजना में 01 नग राजस्व ग्राम मवईकलां एवं 07 नग मजरे मवईकलां, हामिद खेड़ा, फतेहपुर, महबूबखेड़ा, तकिया, तिलकखेड़ा एवं सरैया खेड़ा सम्मिलित है। योजनान्तर्गत 02 नग नलकूप, 02 नग पम्प गृह, 02 नग सोलर पैनल, 01 नग शिरोपरि जलाशय (300 कि०ली०/12 मी० स्टेजिंग), 21.456 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 966 नग पेयजल गृह संयोजन इत्यादि के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग नलकूप, 02 नग पम्प हाउस, 02 नग सोलर पैनल, 25 प्रतिशत अवर जलाशय, 19.324 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 670 नग पेयजल गृह संयोजन अधिष्ठापन के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना में सम्मिलित 7 नग मजरों में से 06 मजरे क्रमशः हामिद खेड़ा, फतेहपुर, महबूबखेड़ा, तकिया, तिलकखेड़ा एवं सरैया खेड़ा में आंशिक रूप से सीधे पम्पिंग के माध्यम से क्लोरीनयुक्त शुद्ध एवं सुरक्षित जलापूर्ति की जा रही है तथा शेष मजरा मवईकलां में वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे 10 दिवस में पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जाएगी।

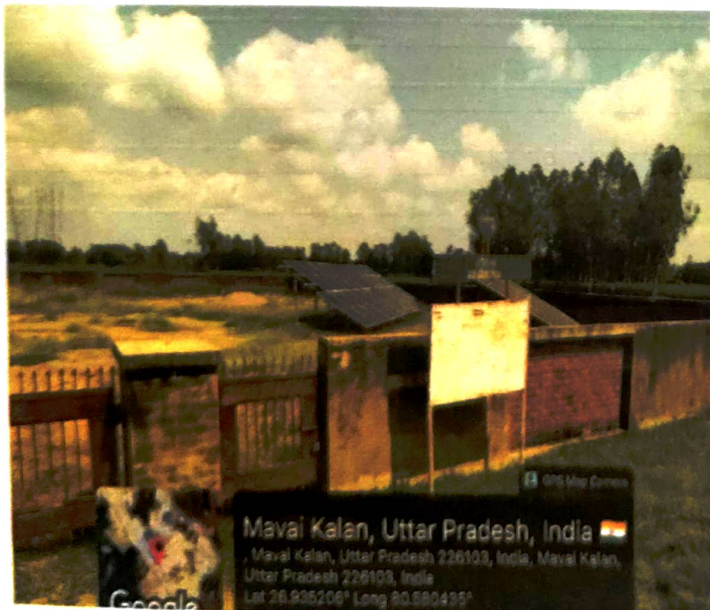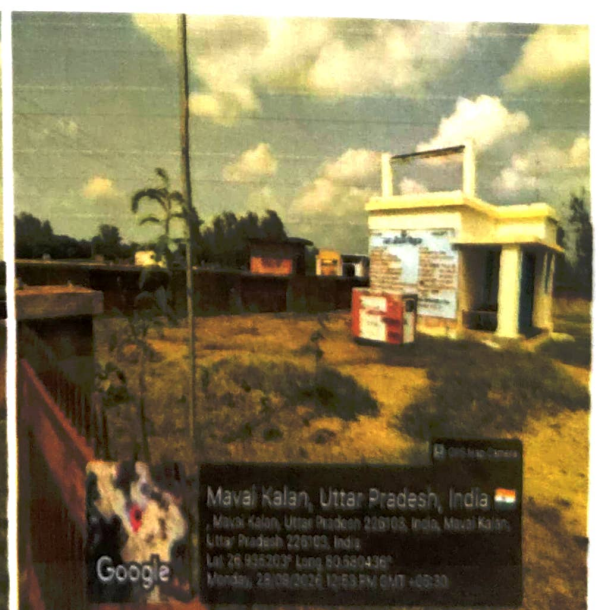

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कराने की लक्षित तिथि मार्च 2027 निर्धारित है। योजना के अवशेष समस्त कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए योजना को पूर्ण क्रियाशील एवं जनोपयोगी कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना आप महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय
(ए०के० त्रिपाठी)
अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशायी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
6. मुख्य सम्पादक, समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, लखनऊ।
7. जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
9. पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के समस्त कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता
