



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

सेवा में, पत्रांक 2572 / W-19 / 586 दिनांक 13.10.2026



मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 13.10.2026 को प्रकाशित खबर "कहीं टंकी अधूरी तो कहीं दस साल से सूखे हैं नल" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 13.10.2026 को प्रकाशित खबर "कहीं टंकी अधूरी तो कहीं दस साल से सूखे हैं नल" शीर्षक में ग्राम चक अब्दुल करीम उर्फ पूरे भुलई एवं पाली में जलापूर्ति हेतु खबर प्रकाशित की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड सहसों के पाली ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना में 05 राजस्व ग्राम (पाली, गिरधरपुर, फजिलापुर, मंशी बुजुर्ग एवं चक अब्दुल करीम उर्फ पूरे भुलई) सम्मिलित है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय(425के0एल0/18मी0) 01 नग, वितरण प्रणाली-27720 मी0, घरेलू कनेक्शन 976 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 15 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 22680 मी0, हाउस कनेक्शन 400 नग एवं बाउण्ड्रीवॉल कार्य पूर्ण कराया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर है, जिसको निर्धारित समयावधि अन्तर्गत मार्च-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

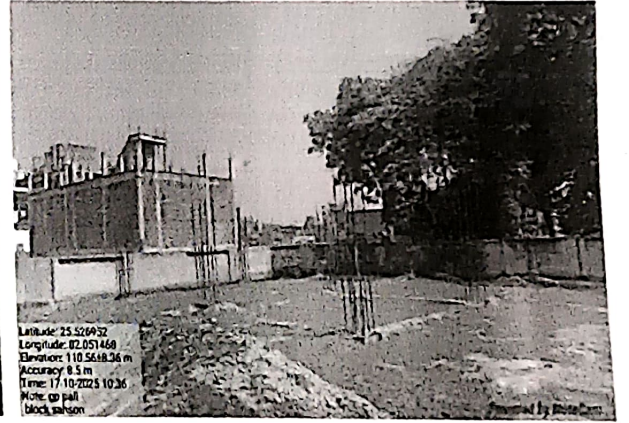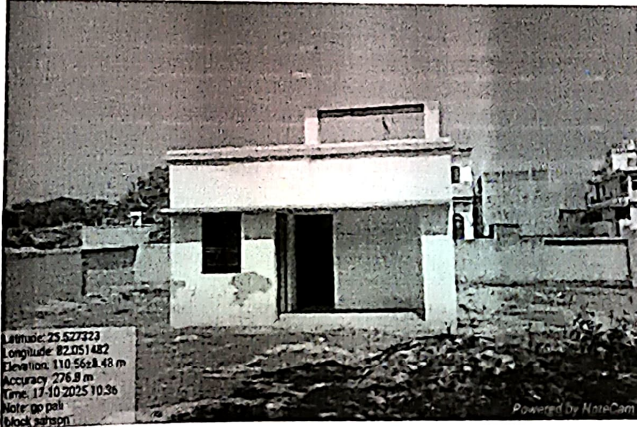

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशायी अभियन्ता
