



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)-चन्दौली।

पत्रांक 7452/पेपर कटिंग / 279 दिनांक 12.10.26

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चन्दौली।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "सकलडीहा में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: 5000 की आबादी को पानी का संकट, ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी" के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी "दैनिक भास्कर" में दिनांक- 11.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "सकलडीहा में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: 5000 की आबादी को पानी का संकट, ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासखण्ड सकलडीहा के पटपरा गांव में सूचीबद्ध फर्म मैसर्स वी०एस०ए०आई०पी०पी०एल०-एस०एम०सी० जे०वी० के द्वारा पटपरा पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त योजना में प्रस्तावित कार्यों के अन्तर्गत 01 नग ट्यूबवेल, पम्प हाउस, बाउण्ड्री वॉल, शिरोपरि जलाशय (क्षमता 250 के०एल०/16मी०) का कार्य 90 प्रतिशत, सोलर पैनल, पाइप लाइन 13498 मी० के सापेक्ष 6450 मी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त योजना को मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना के समस्त अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करके जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चन्दौली।
5. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता

सकलडीहा में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: 5000 की आबादी को पानी का संकट, ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी

अनिल पटेल | गोधना(पीडीडीयू नगर), चंदौली | 11/10/26



🕒 शेयर

जल जीवन मिशन की टंकी 4 साल से अधूरी।

सकलडीहा विकास खंड के पटपरा गांव में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी चार साल से अधूरी है। इससे करीब 5000 की आबादी वाले गांव में पीने के पानी का संकट गहरा गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही से टंकी का काम रुका है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल-जल पहुंचाने का वादा था, पर गर्मी में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।




Latitude: 25.305277
Longitude: 83.152935
Elevation: 76.95±2.5 m
Accuracy: 5.67 m
Time: 15-09-2026 11:06
Note: gp patpara block sakaldih



Latitude: 25.305378
Longitude: 83.153058
Elevation: 79.16±2.5 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 15-09-2026 11:05
Note: gp patpara block sakaldih

Latitude: 25.305387
Longitude: 83.153027
Elevation: 77.95±2.5 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 15-09-2026 11:05
Note: gp patpara block sakaldih

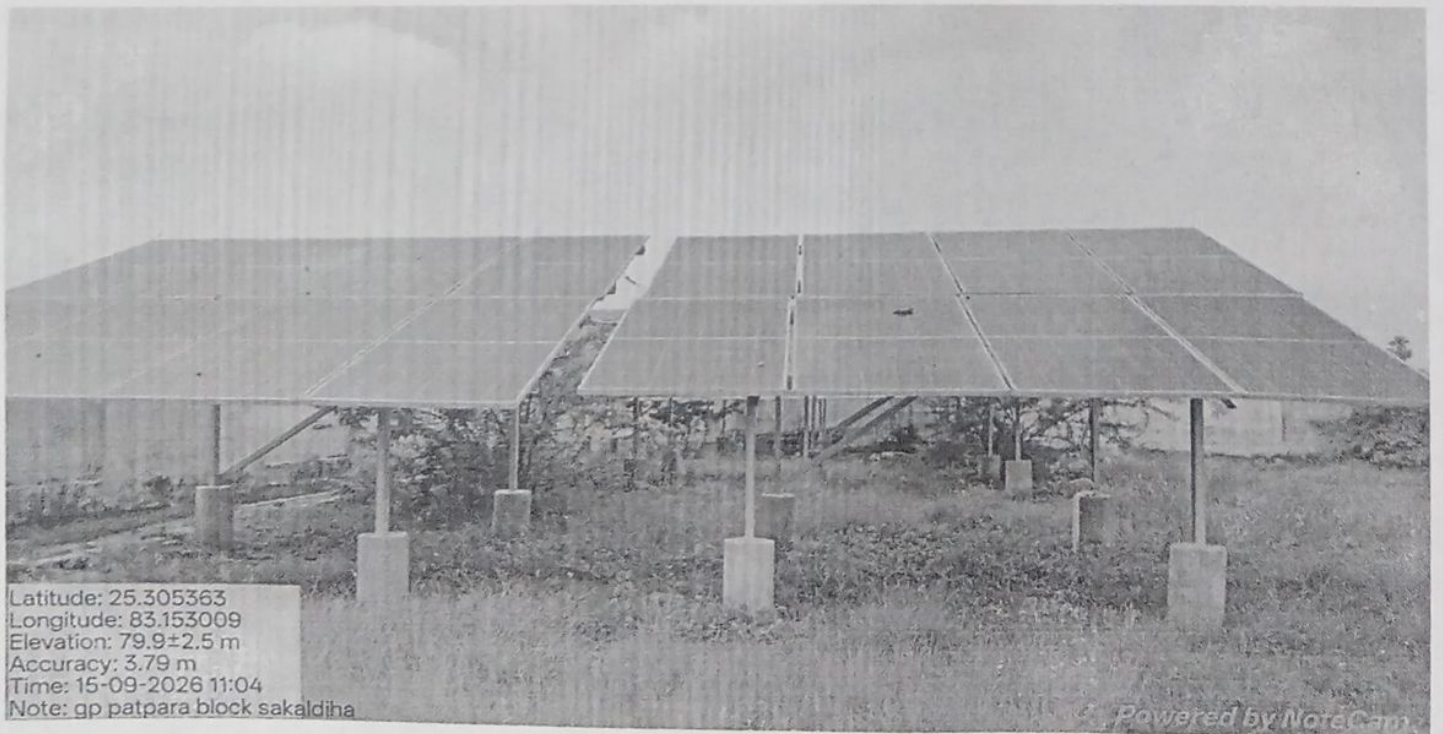

Latitude: 25.305363
Longitude: 83.153009
Elevation: 79.9±2.5 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 15-09-2026 11:04
Note: gp patpara block sakaldih

Powered by NoteCam
