



उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, बलरामपुर

प्रारम्भिक रेलवे स्टेशन रोड, निकट निदान अस्पताल, मोतीरामपुर (तुलसीपूर), बलरामपुर

Email Id:
cdr_balrampur@yahoo.com

Moblie. No.
9151919684

पत्रांक: 1933/अम-16/36
सेवा में,

दिनांक: 24/10/2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर न्यूज पोर्टल पर दिनांक: 25.10.2026 को प्रकाशित खबर " बलरामपुर के नेवासपुर में जल जीवन मिशन फेल: कागजों पर नल लगे, ग्रामीण बूंद-बूंद पानी को तरसे " शीर्षक के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर न्यूज पोर्टल पर दिनांक: 25.10.2026 को प्रकाशित खबर " बलरामपुर के नेवासपुर में जल जीवन मिशन फेल: कागजों पर नल लगे, ग्रामीण बूंद-बूंद पानी को तरसे " शीर्षक के सम्बन्ध में आप द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जांच आख्या निम्नवत् है-

क्र.सं.	विन्दु	आख्या
01	बलरामपुर के नेवासपुर गांव में जल जीवन मिशन फेल हो गया है। यहां ग्रामीण पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। कागजों पर नल लगे हैं, लेकिन जमीन पर एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। सरकार साफ पानी पर करोड़ों खर्च कर रही है, पर ग्रामीणों को गंदा और कम पानी मिल रहा है। इस व्यवस्था से परेशान होकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने जलशक्ति मंत्री और अधिकारियों को भी पत्र भेजा है, जिसमें साफ पानी की नियमित सप्लाई मांगी गई है। विकास, पप्पू लाल, बिहारी, अशोक कुमार, प्रेम नारायण, मनोज कुमार, सुशील कुमार, गुड्डू और राजेश कुमार समेत कई ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर वे आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।	प्रकाशित समाचार विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत नेवासपुर(नेवाजपुर) से सम्बन्धित है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत नेवाजपुर को पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना है। उक्त पेयजल योजना पर वर्तमान तक फर्म द्वारा 01 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण है। बाउण्ड्रीवाल का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। एफएचटीसी 896 नग के सापेक्ष 752, वितरण प्रणाली 6206 मी० के सापेक्ष 6000 मी० पूर्ण किया गया है। ओ०एच०टी० क्षमता 275 कि०ली०/16 मी० का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है। नेवाजपुर पेयजल योजना पर विगत 2 वर्ष से शासन स्तर से धनावटन न होने के कारण अवशेष कार्य की प्रगति धीमी रही है। वर्तमान में सिंगल विलेज योजना पर शासन द्वारा भुगतान हेतु लिमिट जारी कर दी गयी है। फर्म को अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म द्वारा अवशेष कार्य मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।


भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
दिनांक / / 2026

पृ०सं० / /
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०, खण्ड कार्यालय, बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता

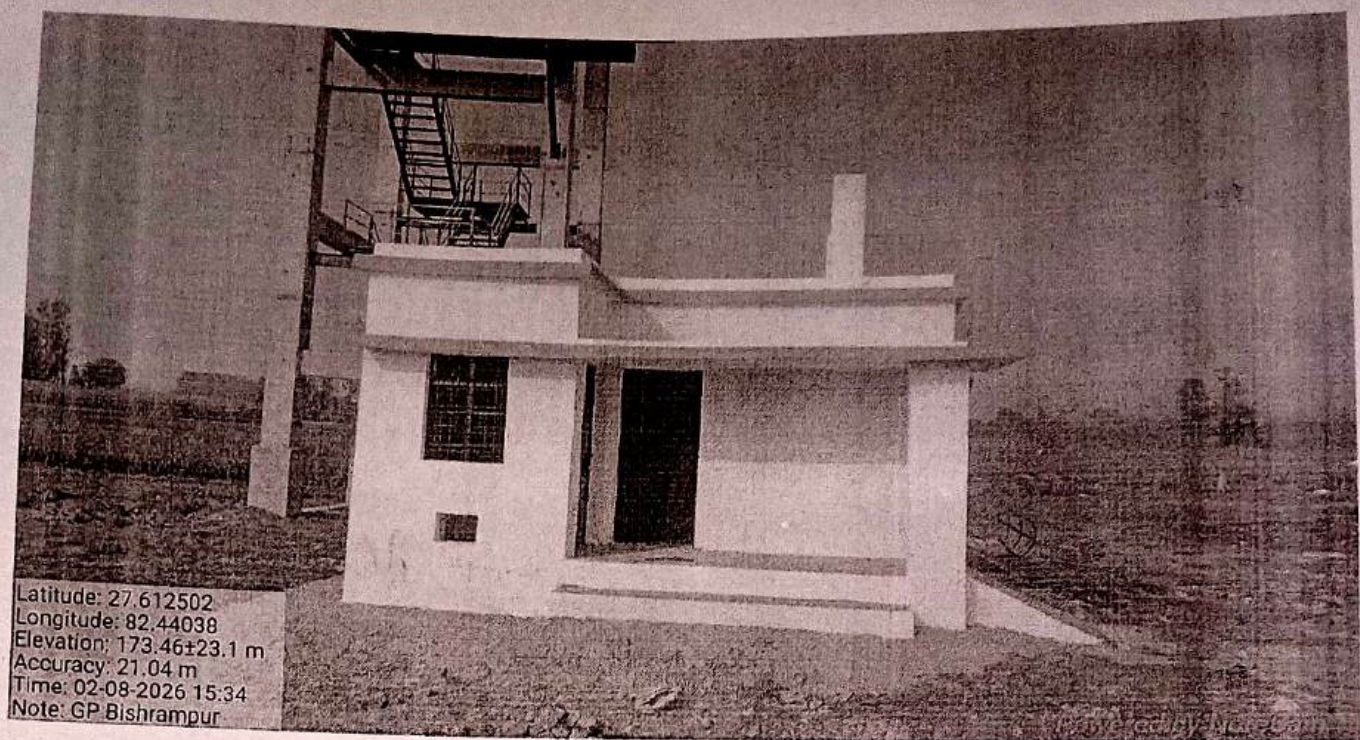

फोटोग्राफ्स-संलग्नक 01(नेवाजपुर पाइप पेयजल योजना, वि०ख० तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर)
