

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)

औद्योगिक क्षेत्र संत कबीर नगर। - खलीलाबाद, जनपद,

edsantkabirnagar@gmail.com - mail I.D:-E, -: mail I.D-E eeruralskngmail.com@,

पत्रांक 970 / W-05 / 161 दिनांक 29-10-2026
सेवा में,


प्रबन्ध निदेशक महोदय,

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।

विषय - गोरखपुर ब्यूरो समाचार पत्र में दिनांक 26.10.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2026 गोरखपुर ब्यूरो समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "खत्म नहीं हो रहा पानी का इंतजार" के संबंध में अवगत कराना है कि वि० ख०- हेंसर बाजार में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भरतपुरा पेयजल योजना के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय का कार्य 30 प्रतिशत, पम्प हाऊस, बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है तथा पाइप लाइन का कार्य 6.00 किमी० के सापेक्ष 4.36 किमी० पूर्ण है तथा हाउस कनेक्शन का कार्य 452 नग के सापेक्ष 125 नग पूर्ण है, उक्त योजना पर शेष कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही योजना पर कार्य पूर्ण कर समस्त ग्रामवासियों को जलापूर्ति प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

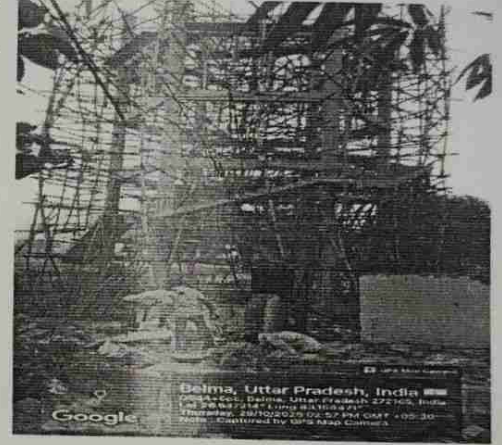

भवदीय

(महेन्द्र राम)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, संतकबीरनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
5. संबंधित सहायक अभियन्ता / जू० इ०।
6. कार्यदायी फर्म मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा० लि०, संतकबीरनगर।

अधिशासी अभियन्ता
