



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

दूरभाष:- 9473942572, ई0-मेल eeupjnrrural22@gmailcom



पत्रांक
सेवा में

1001

/ M-8

/ 107

दिनांक 31.08.2026

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय :
महोदय,

शासन से प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

है—

बरेली / समाचार पत्र दैनिक भास्कर बरेली, दिनांक 29.08.2026 के सन्दर्भ में वांछित आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित

क्र0 सं0	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बरेली	दैनिक भास्कर दिनांक 29-08-2026	कचौली में जल जीवन मिशन टंकी का काम रुका: घर-घर पानी पहुंचाने की योजना अटकी, ग्रामीण परेशान 	सादर अवगत कराना है कि जनपद बरेली के तहसील सदर, विकास खण्ड बिथरी चैनपुर के ग्राम कचौली में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वालीपुर अहमद एवं उगनपुर पेयजल योजना में प्रस्तावित अवर जलाशय (250KL/18m) 40 प्रतिशत तक पूर्ण, पम्प हाउस पूर्ण, नलकूप पूर्ण, बाउन्ड्रीवॉल पूर्ण, पाइप लाइन 19.07 कि0मी0 के सापेक्ष 6.78 कि0मी0 एवं गृह संयोजन 682 नग के सापेक्ष 250 नग किये जा चुके हैं, पाइप लाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़कों को मोटेरेबल कर दिया गया है, वर्तमान में उक्त पेयजल योजना में पाइप लाइन, गृह संयोजन, ज्वाइंटिंग के कार्य अवशेष हैं। साथ ही अवगत कराना है कि फर्म को भुगतान न हाने के कारण योजना के कार्य लम्बित थे। वर्तमान में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अवशेष कार्यों को पूर्ण करा सम्बन्धित ग्रामवासियों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के द्वारा अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा कर समयान्तर्गत पूर्ण करने के लिए सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।	

भवदीया

(आकांक्षा सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि— सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0इंजी0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

दूरभाष:- 9473942572, ई0-मेल eeupjnrrural22@gmailcom



पत्रांक
सेवा में

1001

/ M-8

/ 107

दिनांक 31.08.2026

प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)

लखनऊ।

विषय :

शासन से प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

बरेली / समाचार पत्र दैनिक भास्कर बरेली, दिनांक 29.08.2026 के सन्दर्भ में वांछित आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित है-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बरेली	दैनिक भास्कर दिनांक 29-08-2026	कचौली में जल जीवन मिशन टंकी का काम रुका: घर-घर पानी पहुंचाने की योजना अटकी, ग्रामीण परेशान 	सादर अवगत कराना है कि जनपद बरेली के तहसील सदर, विकास खण्ड बिथरी चैनपुर के ग्राम कचौली में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वालीपुर अहमद एवं उगनपुर पेयजल योजना में प्रस्तावित अवर जलाशय (250KL/18m) 40 प्रतिशत तक पूर्ण, पम्प हाउस पूर्ण, नलकूप पूर्ण, बाउन्ड्रीवॉल पूर्ण, पाइप लाइन 19.07 कि0मी0 के सापेक्ष 6.78 कि0मी0 एवं गृह संयोजन 682 नग के सापेक्ष 250 नग किये जा चुके हैं, पाइप लाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़कों को मोटरेबल कर दिया गया है, वर्तमान में उक्त पेयजल योजना में पाइप लाइन, गृह संयोजन, ज्वाइंटिंग के कार्य अवशेष हैं। साथ ही अवगत कराना है कि फर्म को भुगतान न हाने के कारण योजना के कार्य लम्बित थे। वर्तमान में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अवशेष कार्यों को पूर्ण करा सम्बन्धित ग्रामवासियों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के द्वारा अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा कर समयान्तर्गत पूर्ण करने के लिए सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।	

भवदीया

(आकांक्षा सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0इंजी0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

जीवन मंत्र

देश

विदेश

राशिफल

टेक - ऑटो

ओपिनियन

मध्य प्रदेश

उत्तरप्रदेश

राजस्थान

बिहार


यूपी खास

Download App from



बरेली जिले के कचौली गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है। मौके पर टंकी का ढांचा तो खड़ा हो गया है, लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

टंकी का परिसर और संबंधित भवन भी बदहाल स्थिति में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर तक नल से पानी पहुंचाना है, लेकिन निर्माण अधूरा होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

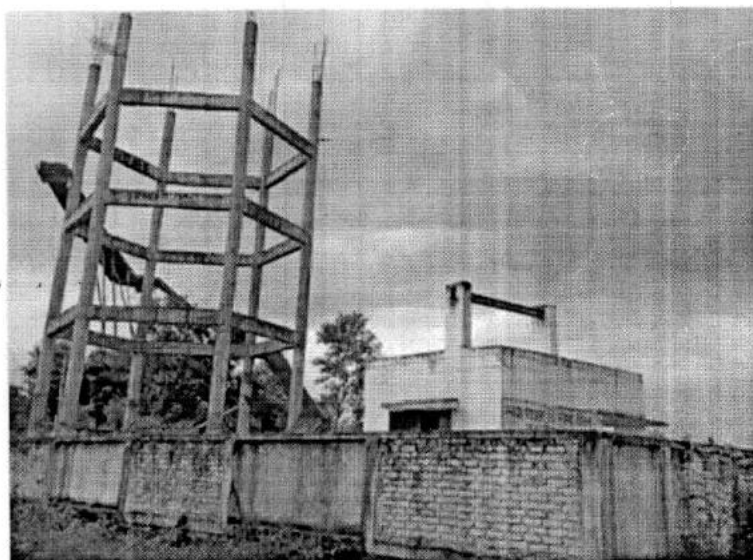

यह पहली बार नहीं है जब बरेली जिले में जल जीवन मिशन की परियोजनाएं अधूरी पाई गई हों; इससे पहले भी ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। कचौली परियोजना की लागत 334.35 लाख रुपये है और इसे 04 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था।

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से इस अधूरे निर्माण की तत्काल जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कार्य को जल्द पूरा कर गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू करने की अपील की है।
