



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), एटा
 जिला पंचायत परिसर, एटा 207001
 ई-मेल eeupinetahrural@gmail.com & upinretah@upjn.co.in



पत्रांक 116 / पेपर फिटिंग की सूचना / 01 दिनांक :- 07-09-2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद एटा।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 06.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गॉव चाठी में पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका पानी की टंकी का निर्माण" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद एटा में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 06.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गॉव चाठी में पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका पानी की टंकी का निर्माण" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चाठीरफीपुर पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 1 नग (350 किली०/16मी०) अवर जलाशय के सापेक्ष कार्य पूर्ण है। प्रस्तावित 11.493 किमी० पाइप लाइन के सापेक्ष 11.656 किमी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 2 नग पम्प हाउस, 2 नग बाउण्ड्रीवॉल का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है। प्रस्तावित 802 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 487 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण है। पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों को मोटरेबुल करा दिया गया है। योजना को सी०आई०आर०पी० के अनुसार पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि 31.01.2027 है। साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान में सीधे नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत गृह जल संयोजन एवं अवर जलाशय की पुताई एवं डी०आई० पाइप फिटिंग का कार्य प्रगति पर है। जिसे अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि फर्म को धीमी प्रगति के कारण पूर्व में ही 6 प्रतिशत अर्थ दण्ड भारित किया गया है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद एटा।
7. अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र एटा।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एटा।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), एटा
जिला पंचायत परिसर, एटा 207001
ई-मेल eeupinetahrural@gmail.com & upjnretah@upjn.co.in



पत्रांक 116 / पेपर फिटिंग की सूचना / 01 दिनांक :- 07-09-2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद एटा।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 06.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गॉव चाठी में पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका पानी की टंकी का निर्माण" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद एटा में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 06.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गॉव चाठी में पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका पानी की टंकी का निर्माण" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चाठीरफीपुर पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 1 नग (350 किली०/16मी०) अवर जलाशय के सापेक्ष कार्य पूर्ण है। प्रस्तावित 11.493 किमी० पाइप लाइन के सापेक्ष 11.656 किमी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 2 नग पम्प हाउस, 2 नग बाउण्ड्रीवॉल का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है। प्रस्तावित 802 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 487 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण है। पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों को मोटरेबुल करा दिया गया है। योजना को सी०आई०आर०पी० के अनुसार पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि 31.01.2027 है। साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान में सीधे नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत गृह जल संयोजन एवं अवर जलाशय की पुताई एवं डी०आई० पाइप फिटिंग का कार्य प्रगति पर है। जिसे अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि फर्म को धीमी प्रगति के कारण पूर्व में ही 6 प्रतिशत अर्थ दण्ड भारित किया गया है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद एटा।
7. अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र एटा।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एटा।

अधिशासी अभियन्ता


अमर उजाला एटा पेज नं- 4 (अलीगढ़)

गांव चाठी में पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका पानी की टंकी का निर्माण

मिरहची। जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र के गांव चाठी में निर्माणाधीन पानी की टंकी का पांच वर्ष में भी निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में लोगों का नल से जल का सपना अधूरा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की टंकी के चारों ओर बांस-बल्ली लगी है। टंकी के पास पाइपलाइन पाइप जंग खा रही है। गांव में घरों तक पानी पहुंचाने के लिए बिछाई गई पाइप लाइन जगह-जगह से टूट गई है। शिकायत के बाद भी जल निगम ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है।

पाइप लाइन बिछाने को उखाड़ी गई गलियों की मरम्मत नहीं कराई गई

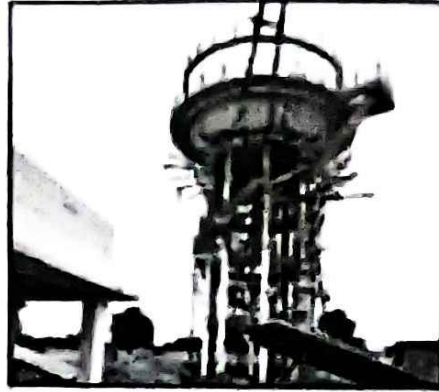

मिरहची क्षेत्र के गांव चाठी में अधूरा पड़ा पानी की टंकी का निर्माण।

है, जिससे गलियों में कीचड़ हो रहा है। गांव के लोगों ने पानी की टंकी के निर्माण को पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन से मांग की है। सतत

निरीक्षा शाखा

 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
