



Mob- 9473942685

E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: 1528/दैनिकसमाचार पत्र / 40

दिनांक: 16/09/2026

सेवा में,



जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।

विषय: समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "मरही बिन्द में पानी की टंकी अधर में लटकी" जल जीवन मिशन उपेक्षा, ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "मरही बिन्द में पानी की टंकी अधर में लटकी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जल जीवन मिशन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के विकास खण्ड— जलालपुर के मरही बिन्द पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त पेयजल योजना पर फर्म मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित पाइप लाइन 21.68 कि०मी० के सापेक्ष 18.66 कि०मी०, गृह संयोजन 790 नग के सापेक्ष 350 नग, नलकूप, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, सोलर अधिष्ठापन एवं शिरोपरि जलाशय 37 प्रतिशत का कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है। योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार नियोजन (CIAP) के अनुसार योजना के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय दिसम्बर 2027 है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

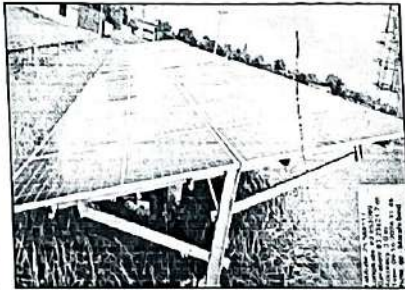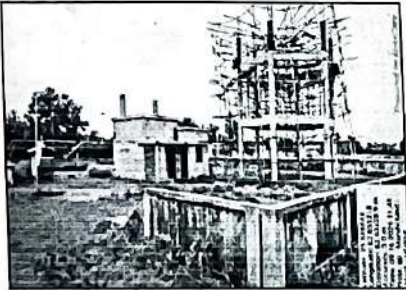

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ज०इ०।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
6. गार्ड फाईल।

दिनांक:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता



Mob- 9473942685

E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: /

दिनांक:

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।



विषय:

समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "मरही बिन्द में पानी की टंकी अधर में लटकी" जल जीवन मिशन उपेक्षा, ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "मरही बिन्द में पानी की टंकी अधर में लटकी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जल जीवन मिशन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के विकास खण्ड- जलालपुर के मरही बिन्द पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त पेयजल योजना पर फर्म मेसर्स एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित पाइप लाइन 21.68 कि०मी० के सापेक्ष 18.66 कि०मी०, गृह संयोजन 790 नग के सापेक्ष 350 नग, नलकूप, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, सोलर अधिष्ठापन एवं शिरोपरि जलाशय 37 प्रतिशत का कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है। योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार नियोजन (CIARP) के अनुसार योजना के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय दिसम्बर 2027 है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

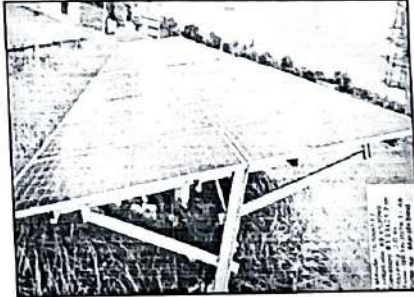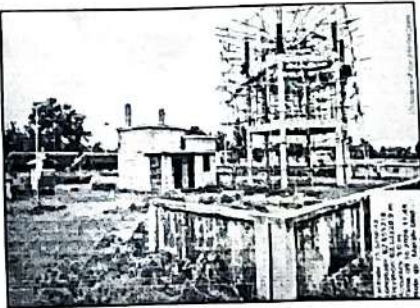

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० 1528 / दैनिक समाचार पत्र / 40 दिनांक: 16/09/2026
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / जू०इ०।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
6. गार्ड फाईल।

अधिशाली अभियन्ता
