



उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, बलरामपुर

शास्त्रपट्टी रेलवे स्टेशन रोड, निकट विधान अस्पताल, मोतीशायर (तुलसीबाग), बलरामपुर

Email Id:
cdr_balrampur@yahoo.com

Mobile No.
9151919684

पत्रांक: 1655/एम-16/31
सेवा में,

दिनांक: 14/09/2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक: 11.09.2026 को प्रकाशित खबर " सोनपुर में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: 2 करोड़ की परियोजना अधर में लटकी, शुद्ध पानी के लिए ग्रामीण परेशान" शीर्षक के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक: 11.09.2026 को प्रकाशित खबर " सोनपुर में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: 2 करोड़ की परियोजना अधर में लटकी, शुद्ध पानी के लिए ग्रामीण परेशान" शीर्षक के सम्बन्ध में आप द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जांच आख्या निम्नवत् है-

क्र.सं.	विन्दु	आख्या
01	तुलसीपुर विकासखण्ड के सोनपुर धुतकहवा गांव में जल जीवन मिशन योजना का काम अधूरा पड़ा है। सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। करीब 2 करोड़ 13 लाख 55 हजार रुपये की लागत से बन रही इस योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से ग्रामीणों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें नाराजगी है। ग्रामीणों नानबच्चा, भड़काऊ, महेश, नंदन और शिवम ने बताया कि करीब दो साल पहले गांव के आधे हिस्से में पाइपलाइन बिछाई गई थी। लेकिन, रखरखाव की कमी के कारण कई जगह पाइपलाइन टूट गई है। जगह-जगह पाइप टूटे पड़े हैं। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में बन रहा वाटर टैंक भी आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है। योजना स्थल की बाउंड्रीवाल का काम भी पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि काम अधूरा होने की वजह से योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन टूटी होने और निर्माण सामग्री इधर-उधर पड़े रहने से योजना की हालत और खराब होती जा रही है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधूरे काम को जल्द पूरा कराने और पेयजल योजना को शुरू करने की बात कही है, ताकि गांव के लोगों को जल जीवन मिशन का सही लाभ मिल सके।	प्रकाशित समाचार विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत सोनपुर धुतकहवा से सम्बन्धित है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स द्वारा इको प्रोटेक्शन(जे०बी०) द्वारा विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत सोनपुर धुतकहवा को पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना है। उक्त पेयजल योजना पर वर्तमान तक फर्म द्वारा 01 नग द्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण है। बाउंड्रीवाल का कार्य 80 प्रतिशत, एफ०एच०टी०सी० 585 नग के सापेक्ष 150, वितरण प्रणाली 6574 मी० के सापेक्ष 5500 मी० पूर्ण किया गया है। ओ०एच०टी० क्षमता 200 कि०ली०/12 मी० का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है। सोनपुर धुतकहवा पेयजल योजना पर विगत 2 वर्ष से शासन स्तर से धन आवंटन न होने के कारण अवशेष कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। वर्तमान में सिंगल विलेज योजना पर शासन द्वारा भुगतान हेतु लिमिट जारी कर दी गयी है। फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जायेगा तथा फर्म को अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय

पृ०सं०


प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०, खण्ड कार्यालय, बलरामपुर।

दिनांक

(सुरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
/2026

अधिशासी अभियन्ता

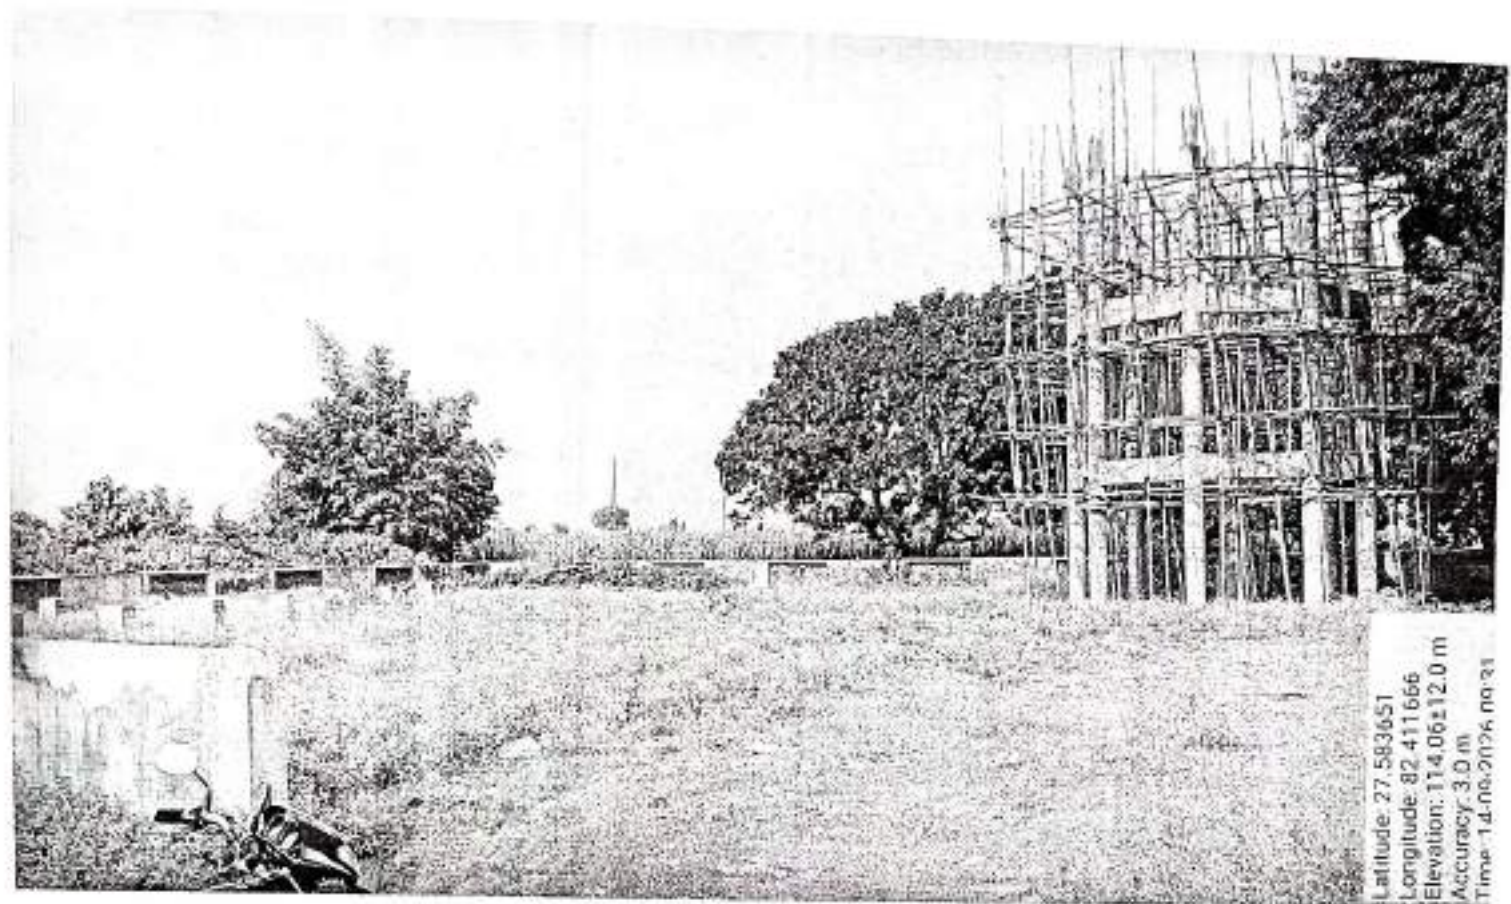

Latitude: 27.583651
Longitude: 82.411666
Elevation: 114.06±12.0 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 14-08-2026 09:21

फोटोग्राफ्स-संलग्नक 01(सोनपुर धुतकहवा पाइप पेयजल योजना, वि०ख० तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर)
