



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम- भन्सरिया, पो-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक 3068 / M-48 / 143 दिनांक 24/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 24.09.2026 को प्रकाशित खबर - "एक कि०मी० सड़क के लिए 17 साल से इंतजार" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,


उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 24.09.2026 को प्रकाशित खबर विकास खण्ड-निघासन "एक कि०मी० सड़क के लिए 17 साल से इंतजार" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना लक्षित है। नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-535515 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1147 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की प्रकाशित खबर विकास खण्ड-निघासन से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जसनगर पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य कार्यदायी एजन्सी मेसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नलकूप-01 नग, पम्प हाउस-01 नग, वितरण प्रणाली-10.57 कि०मी०, शिरोपरि जलाशय 175 कि०ली०, स्टैंजिंग 16 मी० - 01 नग व गृह जल संयोजन 581 नग प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग, पम्प हाउस-01 नग, वितरण प्रणाली 10.00 कि०मी०,

शिरोपरि जलाशय 80 प्रतिशत एवं गृह जल संयोजन-270 नग पूर्ण है। उक्त खबर का संज्ञान लेकर सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर श्री अंशू वर्मा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बिछायी गयी वितरण प्रणाली के लिए सड़को को काटा गया था जिन्हें पूर्व में ही मोटरेबल कर दिया गया था परन्तु वर्तमान में जलभराव व बारिश के कारण कुछ स्थानों पर सड़के पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसे मरम्मत कार्य हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। उक्त कार्य को खण्ड कार्यालय से सतत अनुश्रवण करते हुए जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़को को मोटरेबल करा दिया जाएगा। पाइप लाइन टेस्टिंग व कनेक्शन होने के पश्चात समस्त सड़को की परमानेन्ट मरम्मत करा दी जायेगी। योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण किए जाने की लक्षित तिथि माह दिसम्बर-2027 है।

सादर सूचनार्थ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

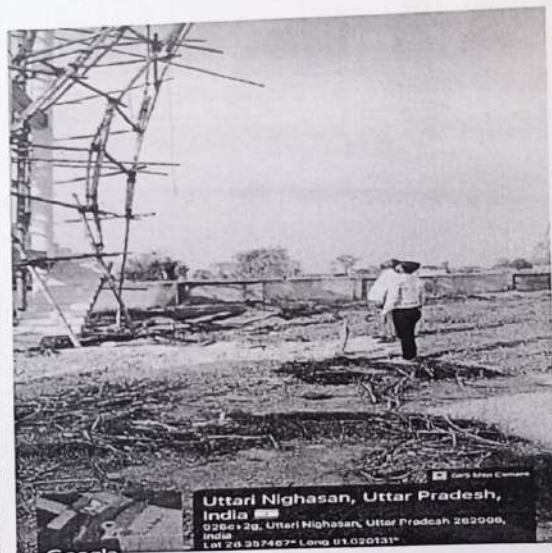

भवदीय


अधिशायी अभियन्ता।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ, उ०प्र०।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई० (खण्डान्तर्गत)।
3. मो० जमाल (डी०पी०एम०), मे० एन०सी०सी० लि० लखीमपुर खीरी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त पाइप पेयजल योजना में वितरण प्रणाली बिछाने के लिए तोड़ी/काटी समस्त क्षतिग्रस्त सड़को को शीघ्र अति शीघ्र मोटरेबल कराना सुनिश्चित करे।
4. गार्ड फाइल।

अधिशायी अभियन्ता।
