

E-mail : eejalgraminbanda@gmail.com

Mob. : +91 9473941981



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

गेट न०-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड-210001

पत्रांक :- 680 / W-08 / 34

दिनांक :- 29 / 07 / 2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' बाँदा/चित्रकूट संस्करण के दिनांक 26.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "बाँदा के बंदौसा में जल जीवन मिशन योजना विफल : फटी पाइप लाइनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद, ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे" के सम्बन्ध में आख्या।

नहोदय,

कृपया उपरोक्त विषय दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' बाँदा/चित्रकूट संस्करण के दिनांक 26.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "बाँदा के बंदौसा में जल जीवन मिशन योजना विफल : फटी पाइप लाइनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद, ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे" के कम में अवगत कराना है कि जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन (फेज-I) में खटान ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड नरैनी में संचालित खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 342 राजस्व ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने हेतु 01 नग इन्टेकवेल क्षमता 158 एम०एल०डी०, 01 नग डब्ल्यू०टी०पी० क्षमता 158 एम०एल०डी०, 116 नग उर्ध्व जलाशय, 39 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 4215 कि०मी० पाइप लाइन व 127889 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का कार्य पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति संचालित की जा रही है एवं वर्तमान तक 324 नग ग्रामों को हर घर नल प्रमाणीकरण की कार्यवाही भी पूर्ण करायी जा चुकी है, अवशेष कार्यों को अगस्त, 2026 तक पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराया जाना लक्षित है।

1- ग्राम बंदौसा :- विकासखण्ड नरैनी में खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दुबरिया में निर्मित शिरोपरि जलाशय (850 कि०ली०/20 मीटर) से ग्राम बंदौसा में 14755 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1249 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 1214 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 3500 मीटर सी०सी० रोड के मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में लीकेज/चाकेज के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं समस्त अवशेष कार्यों को 15 दिवस में कराते हुए शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुचारु किया जाना लक्षित है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जिसकी फोटोग्राफ संलग्न है।

2- ग्राम बरछा-ब :- विकासखण्ड नरैनी में खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दुबरिया में निर्मित शिरोपरि जलाशय (850 कि०ली०/20 मीटर) से ग्राम बंदौसा में 22612 मीटर के सापेक्ष 22460 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 610 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 603 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 2800 मीटर सी०सी० रोड ट्रैच के मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में लीकेज/चाकेज के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं समस्त अवशेष कार्यों को 15 दिवस में कराते हुए शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुचारु किया जाना लक्षित है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जिसकी फोटोग्राफ संलग्न है।

3- ग्राम दुबरिया :- विकासखण्ड नरैनी में खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दुबरिया में निर्मित शिरोपरि जलाशय (850 कि०ली०/20 मीटर) से ग्राम बंदौसा में 34677 मीटर के सापेक्ष 34400 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1537 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 1425 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 8982 मीटर सी०सी० रोड ट्रैच के सापेक्ष 8550 मीटर सी०सी० रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में लीकेज/चाकेज के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं समस्त अवशेष कार्यों को 15 दिवस में कराते हुए शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुचारु किया जाना लक्षित है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जिसकी फोटोग्राफ संलग्न है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कियोजना से सम्बन्धित कोई भी शिकायत जल सास्थी मोबाईल ऐप एवं टोल-फ्री नम्बर-1800-1212-164 पर की जा सकती है। विभाग समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
VIMAL KUMAR VERMA

Date: 29-07-2026
17:52:55

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
- 2- अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे), बाँदा।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, बाँदा।
- 4- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

- 5- मैसर्स एल०एण्ड०टी० लि०, बाँदा को इस निर्देश के साथ कि अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

अधिशासी अभियन्ता



बांदा के बंदौसा में जल जीवन मिशन योजना विफल: फटी पाइपलाइनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद, ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे

संतोष कुशवाहा | बंदौसा(नरैनी), बांदा
3 दिन पहले


f X @




जल जीवन मिशन योजना विफल।



बांदा के बंदौसा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुबरिया के नदी टोला में ग्रामीण गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार की करोड़ों रुपये की जल जीवन मिशन योजना के बावजूद, यहां के निवासियों को बूंद-बूंद पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। महिलाएं और पुरुष पानी भरने के लिए बंदौसा धाने के पास तक जाने को मजबूर हैं।

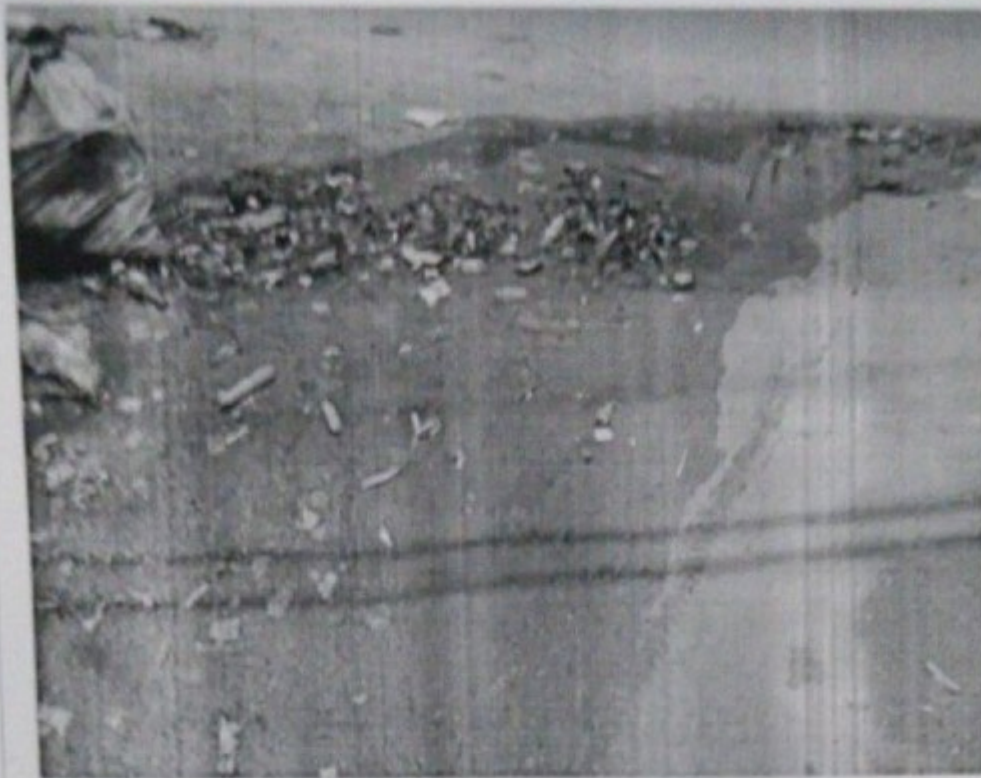

चिन्नकूट धाम मंडल जल संस्थान के टैंकों से किसी तरह पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। तुरंत स्थित पानी की टंकी से नदी टीला तक जलापूर्ति नहीं पहुंच रही है। इसी तरह, जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से भी घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

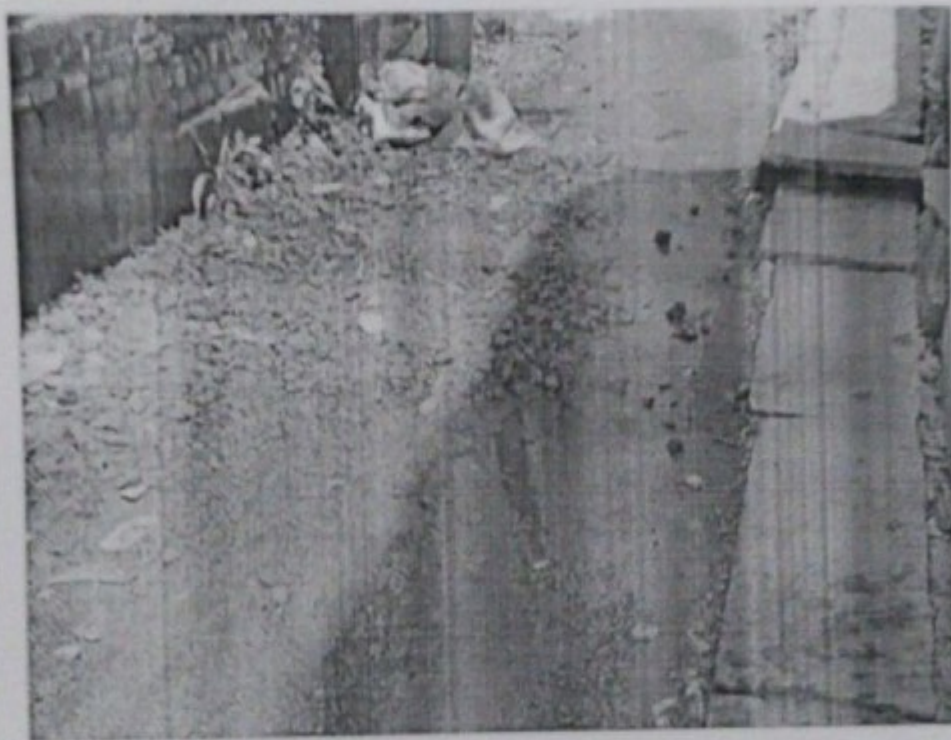

संक्रमण का खतरा भी उत्पन्न

बदौसा, बरछा और दुबरिया क्षेत्र में जल जीवन मिशन की पाइपलाइनें कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे लगातार हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे सड़कों पर जलभराव और कीचड़ फैल रहा है। इस स्थिति से गंदगी बढ़ रही है और संक्रमण का खतरा भी उत्पन्न हो गया है।

नेशनल हाईवे पर प्राथमिक विद्यालय के पास, बदौसा धाने के आगे जियो शोरूम के पास और उससे लगी बस्ती में लगभग पांच स्थानों पर पाइपलाइनें फटी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, हाड़ा रोड स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के पास भी जल जीवन मिशन की पाइपलाइन खुली पड़ी है, जिससे प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है।

प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी बह रहा

दुबरिया के प्रधान/प्रशासक अजीजुल हक उर्फ सोनी और रफीक खान ने आरोप लगाया है कि चित्रकूट धाम मंडल जल संस्थान और जल निगम दोनों विभाग गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं, जबकि फटी पाइपलाइनें केवल पानी की बर्बादी और संक्रमण फैलाने का कारण बन रही हैं।

उन्होंने जलभराव और गंदगी को समाप्त करने तथा दुबरिया के नदी टोला सहित प्रभावित बस्तियों में नियमित और सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है।

जल जीवन मिशन के जूनियर इंजीनियर पार्थकर ने आश्वासन दिया है कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।
