



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम- भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक 1909 / M-48 / 69 दिनांक 01-06-26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.05.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन की टंकियों में पानी नहीं :सिसनौर गांव में योजना का लाभ नहीं, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,


उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.05.2026 को प्रकाशित खबर विकास खण्ड-बांकेगंज "जल जीवन मिशन की टंकियों में पानी नहीं: सिसनौर गांव में योजना का लाभ नहीं, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मैसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना लक्षित है। नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-535515 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1105 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड-बांकेगंज की ग्राम पंचायत सिसनौर पाइप पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति बाधित की खबर प्रकाशित हुई। सिसनौर पेयजल योजना का कार्य एजेंसी मैसर्स वी०टी०एल-गाजा लि० नोएडा द्वारा कराया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर अभिषेक कुमार द्वारा उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान योजना में आंशिक जलापूर्ति हो रही थी व योजना के सोलर/वी०एफ०डी० में कुछ तकनीकी समस्या के कारण योजना का संचालन पूर्ण क्षमता पर नहीं हो पा रहा है जिसे ठीक करने हेतु एजेंसी मैसर्स वी०टी०एल०-गाजा लि० को निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें लगभग एक सप्ताह का और समय लगना संभावित है।

(फोटोग्राफ्स)



00, Rajepur, Grantno 10, Uttar Pradesh 262802, भारत,
अक्षांश: 28.150002, लंबा: 80.389333
20 मई, 26, 08:10 AM, बुधवार

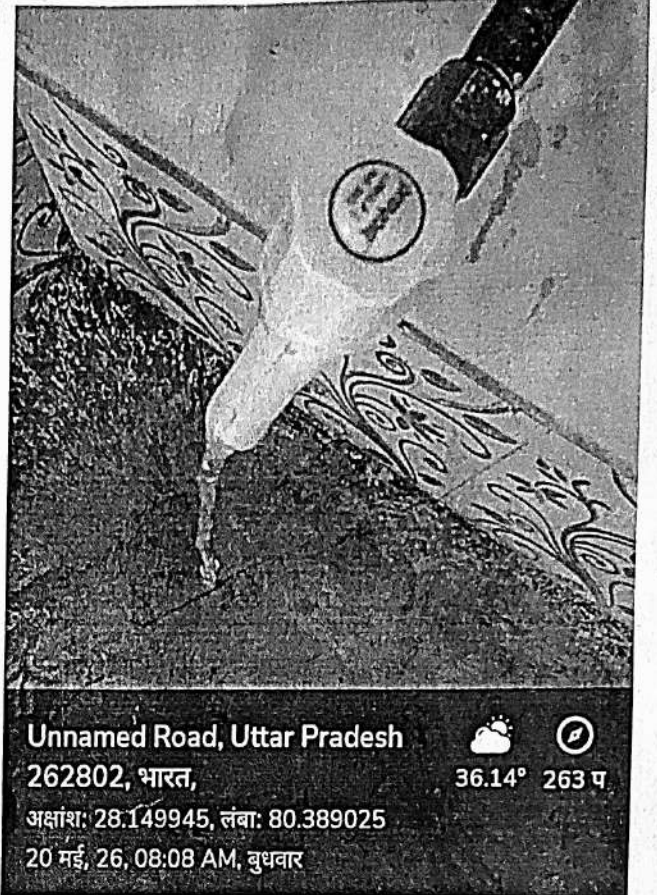

Unnamed Road, Uttar Pradesh 262802, भारत,
अक्षांश: 28.149945, लंबा: 80.389025
20 मई, 26, 08:08 AM, बुधवार

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 2- श्री प्रियांशू यादव, डी०पी०एम०, मै० वी०टी०एल०-गाजा लि० लखीमपुर खीरी को इस आशय के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- 3- गार्ड फाइल।

अधिशाली अभियन्ता।
