



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पड़की, बम्बूगढ़ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा-244221

पत्रांक 2200 / न्यूज कटिंग / 87 दिनांक 15-05-2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

विषय:-


जनपद अमरोहा के दैनिक समाचार पत्र (दिनांक 14.05.2026) में अमर उजाला में प्रसारित न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (14.05.2026) में प्रसारित न्यूज अधोहस्ताक्षरी को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-

हेड लाइन	आख्या
(1) "158.11 लाख रुपये खर्च फिर भी हैंडपंप पर निर्भर विद्यार्थियों संग लोग"	➤ वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 495 नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम 884) में 884 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 676 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ 493 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 200 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन 95.56 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को स्थाई रूप से पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। ➤ खाद गुर्जर पेयजल योजना वि०ख० गजरौला के कार्य मैसर्स-पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय व पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 4.32 कि०मी० के सापेक्ष 4.32 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 354 नग के सापेक्ष 354 नग पूर्ण एवं रास्तों की पूर्व में मरम्मत करा दी गई। वर्तमान में उक्त पेयजल योजना पर निर्धारित समय अनुसार ग्राम में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

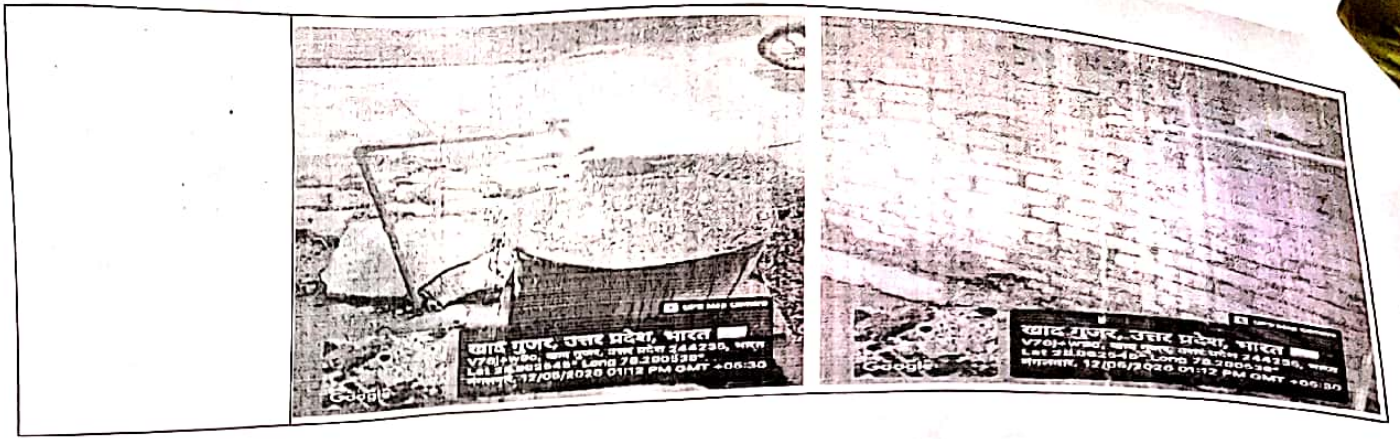

भवदीय

Shah
(चन्द्रहास)

अधिशायी अभियन्ता

Shah

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इं०।
- 6- मैसर्स-पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त पेयजल योजना पर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Shah
अधिशायी अभियन्ता

158.11 लाख रुपये खर्च फिर भी हैंडपंप पर निर्भर विद्यार्थियों

News > Video > **संग लोग** > Amroha News > 158.11 Lakh Rupees Spent, Yet Students And People Depend On Hand Pumps



Vimal Sharma

Updated Thu, 14 May 2026 07:30 PM IST

अमरोहा



अमर
उजाला
amarujala.com



जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाने के लिए 158.11 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी खाद गुर्जर गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों संग गांव स्थित किसान आदर्श इंटर कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक-शिक्षिकाएं भी हैंडपंप से पानी पीने को मजबूर हैं। ब्लॉक की ग्राम पंचायत खाद गुर्जर में पेयजल आपूर्ति के लिए किसान आदर्श इंटर कॉलेज के निकट ओवरहेड टैंक बनाया गया। गांव की हरेक गली की पक्की सड़क को तोड़कर पाइप लाइन बिछाई। इसके अलावा कॉलेज में भी पाइप लाइन डाली गई। इस पर जल जीवन मिशन ने 158.11 लाख रुपये खर्च किए। मगर इसके बावजूद न तो गांव के लोगों को पानी मिल रहा और न ही कॉलेज के स्टाफ और विद्यार्थियों की प्यास बुझ रही है। लोग अपने संसाधनों से प्यास बुझा रहे हैं।
