अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2026 को सिविल लाइन स्थित कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशनके कार्यों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना(पैकेज–1 व 2) तथा 106 राजस्व ग्रामों में पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक दिनांक 26.09.2026 को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे –

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री सन्तोष कुमार शर्मा	जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	श्री मोहन लाल गुप्ता	अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
3	डॉ0 पी0के0 वर्मा	डीप्टी0 सी0एम0ओ0	सी0एम0ओ0 कार्यालय
4	श्री विकास कुमार	वैज्ञानिक–बी	केन्द्रीय भूमी जल बोर्ड लखनऊ
5	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव	उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
6	श्री डी0पी0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता	सिंचाई विभाग
7	श्री धनराज सिंह	सहायक पंचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग
8	श्री नरेन्द्र मोहन	जिला सूचना अधिकारी	जिला सूचना एवं प्रसारण विभाग
9	श्री अविना । सिंह	क्षेत्रिय वनाधिकारी	वन विभाग
10	श्री अतुल त्रिपाठी	डी0सी0, स्वच्छ भारत मिशन	पंचायती राज विभाग
11	श्री दया ाकर	डी0सी0, स्वच्छ भारत मिशन	पंचायती राज विभाग
13	श्री सुनील कुमार	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
14	श्री शिवम राजपुत	सहायक अभियन्ताSWSM	उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
15	श्री मयंक सिंह	जिला समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई
16	श्री देवेन्द्र सिंह	डी0पी0एम0	मैसर्स फिचनर इण्डिया–थर्ड पार्टी एजेन्सी
17	श्री संदीप वार्ष्णेय	डी0टी0एल0	मैसर्स आरवी एसोसियेट–थर्ड पार्टी एजेन्सी (ओएण्डएम)
18	श्री दिनेश कुमार	पी0एम0	मैसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लि0
19	श्री विजय लोखण्डे	परियोजना प्रबन्धक	मैसर्स एन0सी0सी0 लिमिटेड
20	श्री सुशील गंत्यात	डी0पी0एम0	मैसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लि0
21	श्री गौतम शर्मा	प्रतिनिधि	मैसर्स दारा इंजीनियरिंग

CamScanner

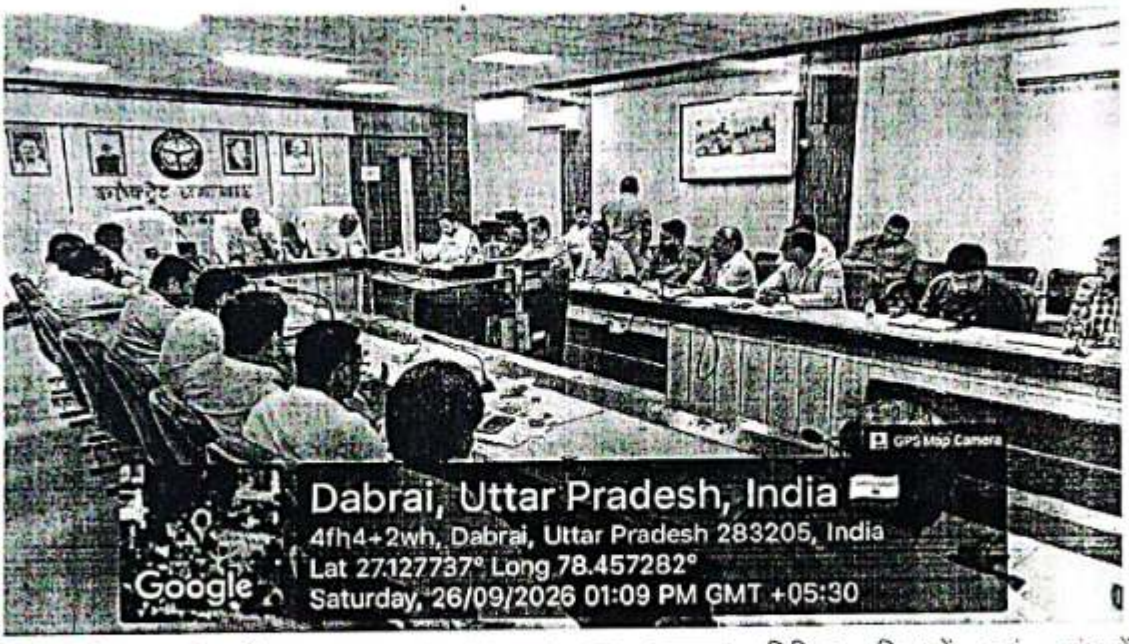

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है :–

TableNo.-1 :JalNigamUnderConstruction (UC)SchemeProgres

Schemes	Villages	<50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	>75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

TableNo.-1 की सूचना शून्य है।

Table No.-1A : JalNigamOperationandMaintenanceSchemeProgress

Total Schemes	TotalVillage	RWSVillage Status		
		FullyFunctional	PartiallyFunctional	NonFunctional
1	2	3	4	5
86	106	0	74	31

CamScanner

TableNo.-1Aके अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को माह – सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें। अभी तक की प्रगति सन्तोषजनक न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाये।

TableNo.-1B :JalNigamRetrofitSchemeProgress

TotalNo of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	TotalNo ofVillage Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	TotalNoof Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	TotalNoof Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	TotalNoof Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	127	108	98	18	20	0	0	90	107

TableNo.-1Bमें जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 98 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

TableNo.-2 :PhysicalProgressPhasewise ,

S. no	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWSVillages		Work Completed		WorkIn Progress			Villagesin O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90%to99% <90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	CompletedOHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Larsen & Toubro Ltd	1	677	0	0 0 0	0 0	0 0	1 677	0 0	1 677	0	249	0
2	[JJM] NCC Ltd.	1	0	0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
3	[Jal Nigam] Dara Engineering	86	106	67	0 1 66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		88	783	67	0 1 66	0 0	0 0	1 677	0 0	1 677	0	249	0

CamScanner

TableNo.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase Wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि –

1– मैसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को जनपद के समस्त स्थलों पर निर्धारित वर्क प्लान एवं मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये कार्यों को पूर्ण तथा पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्दे ित किया जाता है कि आई0बी0पी0एस0–167 एवं Direct Pumping से आच्छादित क्षेत्रों पर सर्वप्रथम जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अतिरिक्त प्रयास कर कार्य पूर्ण करायें। अपरजिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत कराया गया है कि आई0बी0पी0एस0–167 आई0बी0पी0एस0–166 आई0बी0पी0एस0–170 पर निर्माण कार्य की प्रगति माइक्रो प्लान के अनुसार अत्यन्त धीमी है। निर्दे ित किया गया है कि उक्त आई0बी0पी0एस0 पर मेनपावर में व्रधि करते तत्सम्बिन्धित कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित की जाये। साथ ही निर्दे ित किया गया है कि मैसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड द्वारा कार्यो में धीमी प्रगति होने के कारण अधोहस्ताक्षरी की तरफ से अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को पत्र प्रेशित किया जाये।

2– मैसर्स एन0सी0सी0 को वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट का Critical Component फिल्टर हाउस के एक मॉड्यूल को माह– मई, 2027 तक पूर्ण करते हुये वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट को आंशिक क्षमता पर चालू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि कृषकों की भूमि से होकर बिछायी जाने वाली पाइप लाइन के कार्यों को सम्बन्धित किसानों को फसल मुआवजा प्रदान कर मैनपावर बढ़ाते हुये शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये। मासिक कार्य योजना के अनुसार माह सितम्बर, 2026 में जिन घटकों में कार्य लक्ष्य के अनुसार कम है उन्हे आगामी लक्ष्यो में सम्मिलित कर पूर्ण किया जायें।

3– मैसर्स दारा इंजीनियिरिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर को समस्त 86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्राम) में Weekly Completion Plan अधि ासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओंको माह सितम्बर, 2026 तक पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया और अभी तक की प्रगति अपेक्षानुसार न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाये।साथ ही निर्दे ित किया गया है किमैसर्स दारा इंजीनियिरिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चरद्वारा86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्राम) का माह सिम्बर तक पूर्ण रूप से संचालन न होने कि द ा में फर्म के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी की तरफ से अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को पत्र प्रेशित किया जाये।

TableNo.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

S. No.	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWSVillages		Work Completed		WorkIn Progress			Financial Details(Lakh)	
				TotalRWS Villages RWS(%)	100% 90%to99% <90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct PumpingSchemes Villages	No RWS Schemes Villages	EstimatedCost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	0	0 0	0 0%	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	72	72 72	55 76%	0 1 54	72 72	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Total		72	72 72	55 76%	0 1 54	72 72	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

Table No.-2Aमें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओंकी भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें है, SVS (Single Village Scheme)एवं MVS (Multi Village Scheme)। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVSयोजनाओंकी प्रगति के सम्बन्ध मेंजानकारी चाही गयीं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को आवंटित 86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्रामों) में से 72 नग पेयजल योजनाऐं एक ग्राम पेयजल योजनाऐं है, जिनमें से 55 ग्रामों में आंशिक पेयजलापूर्ति की जा रही है। निर्देशित किया गया कि समस्त 72 नग पेयजल योजनाओं के माध्यम से माह – सितम्बर, 2026 तक ग्रामों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।

TableNo.-3:RWS(RegularWaterSupplyVillages)disruption

S. No.	AgencyName	TotalRWS disruption(Village)							O&MRWSdisruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	TulluPump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	TulluPump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Larsen & Toubro Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NCC Ltd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dara Engineering(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CamScanner

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि किन्ही कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो तत्काल नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

TableNo.-4:Certification/JalArpan/JalAklan/RPWSS/Road Restoration

S.No.	AgencyName	Villages	Certification	Jal Arpan	JalAklan	100%Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Larsen & Toubro Ltd	677	0	0	0	7
2	NCC Ltd.	0	0	0	0	0
Total		677	0	0	0	7

Table No.-4में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restorationवाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म के कार्यों को तीव्रगति से पूर्ण कर समस्त ग्रामों में 100प्रति ात जलापूर्ति प्रारम्भ की जाये एवं हर घर जल रिर्पोटेड की श्रेणी में लाते हुये, जल अर्पण हेतु प्लान तैयार कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

TableNo.-4A:RPWSSVillage Details

S.No.	TotalNoof Villages	No of Villages WhereRPWSS Finalized	No of Villages WhereRPWSSis Draft	NoofVillage RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	783	783	0	0	100%

Table No.-4Aमें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओ Sujal Gaon ID/RPWSS IDकी समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि RPWSS IDका कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

TableNo.-5:ComponentsWisePhysicalProgress

Sr.No.	Components	PhysicalProgress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	ओवर हेड टैंक (OHT)	249	249 WP	100.00
2	पाइप लाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	6914	4189	60.59
3	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	282949	93030	32.88

CamScanner

4	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	511	438	85.71
5	वेर्नावजहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	675	7	1.04

Table No.-5में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि –

i-समस्त घटकों के कार्य पूर्ण करते हुये ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मोंको दिये गये।

ii-फर्म मेसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयोंकी व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें, यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ–साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त घटकों का Structural Auditकिसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificateअधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

TableNo.-6:UnifiedCommandandControlSystem(UCCS)-Automation

S.No.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Larsen & Toubro Ltd	1	0	0	0	0	0
2	NCC Ltd.	1	0	0	0	0	0
Total		2	0	0	0	0	0
##	Jal Nigam	86	0	0	0	0	0
Total		88	0	0	0	0	0

Table No.-6में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। फर्म को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करते हुये पेयजल योजनाओं के Integrated कराने का कार्य कराया जाये।

TableNo.-7: GrievanceRedressalSystem

S.No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Larsen & Toubro Ltd	390	383	7	0	0	0
2	NCC Ltd.	2	2	0	0	0	0
3	Dara Engineering (JalNigam)	92	91	1	0	0	0
	Total	484	476	8	0	0	0

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 4 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के **Arsenic/Fluoride/JE/AES** प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

S.No	Description	Total Villages	Completed Villages	Work in Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	42	19	23	45

Table No.-8में फ्लोराइड प्रभावित ग्रामोंमेंपेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फ्लोराइड से प्रभावित 23 ग्रामों, जिनमेंकार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

TableNo.-10:AutomationIntegrated Schemes

S No.	Scheme Status	Pump Status	Scheme Id	Scheme Name	Agency Name	Covered Village	Regular Water Supply	Last Data Receive Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Table No.-10में Automation Interated Schemesकी समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करते हुये पेयजल योजनाओं के SCADA/Automation Interated Systemकराने का कार्य कराया जाये।

अन्य बिन्दु :–

1.फर्म को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाकर कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

CamScanner

2.फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर विद्युत कनैक्शन की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाये।

3. सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु कोशन टेप, बैरिकेटिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यदि कार्य स्थल पर कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Digitally signed by DEVENDRA KUMAR SINGH Date: 15-10-2026 10:10:36	Digitally signed by MOHAN LAL GUPTA Date: 16-10-2026 13:38:11	Digitally signed by SHATROHAN VAISHYA Date: 31-10-2026 12:04:20	Digitally signed by SANTOSH KUMAR SHARMA Date: 31-10-2026 14:48:02
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/ डी0डब्ल्यू0एस0एम0, फिरोजाबाद।	अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), फिरोजाबाद।	मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, फिरोजाबाद।	जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, फिरोजाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 1432 / जलजीवनमिशन/ 246 दिनांक 31.10.2026

:प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. प्रभागीय दनाधिकारी, फिरोजाबाद।
3. जिला चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
6. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
9. प्रतिनिधि, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिचांई, फिरोजाबाद।
11. जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
12. जिला सूचना एवं जल संपर्क अधिकारी, फिरोजाबाद।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), फिरोजाबाद।
15. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
16. डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 (ओ0एण्डएम0), फिरोजाबाद।
17. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, फिरोजाबाद।
18. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज–01 मै0 एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
19. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज–02 मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
20. डी0जी0एम0, मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा0लि0, जोधपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन, फिरोजाबाद।

CamScanner
