अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31.10.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:–

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री अनुपम शुक्ला	जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	श्री आलोक प्रसाद	मुख्य विकास अधिकारी	प्रशासनिक विभाग
3	श्री राजन राय	जिला विकास अधिकारी	प्रशासनिक विभाग
4	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	जिला पंचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग
5	इं0 राजीव कुमार	अधिशासी अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
6	इं0 शशिपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
7	इं0 शुभम सिंह	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
8	श्री राजा राम सिंह	जिला समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई
9	श्री विजय सेठ	डी0पी0एम0	मेसर्स मेधज–थर्ड पार्टी एजेन्सी
10	श्री अभिषेक आनन्द	डी0टी0एल0 (ओ0 एण्ड एम0)	मेसर्स मेधज–थर्ड पार्टी एजेन्सी
11	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स एल0 एण्ड टी0
12	श्री नीरज झाँ	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स वी0एस0ए0
13	श्री अतुल गौड़	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स एच0एफ0सी0एल0

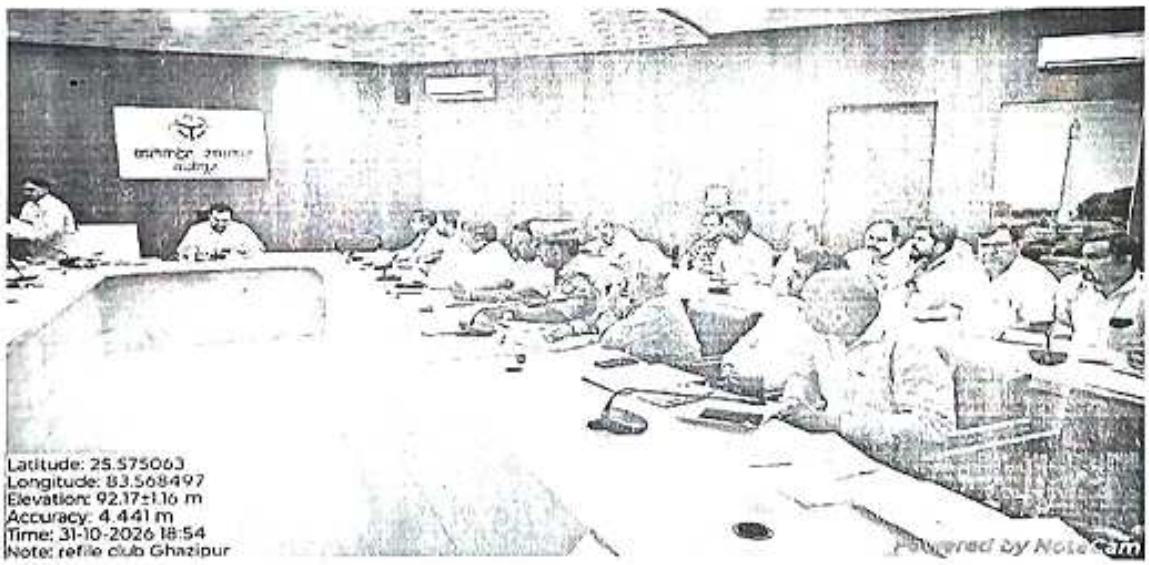

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकडो जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत :–

Table No.-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6
3	16	0	1	2	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह अक्टूबर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	Fully Functional	RWS Village Status Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
132	464	206	254	4

Table No-1 A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म मे मेसर्स सरला के0आई0पी0एल0 को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यो को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजना बद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed/ WIP Schemes	Total No of Village Not Completed/ WIP	No of Financially Not Completed/ WIP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed/ WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	80	32	80	8	18	0	0	24	62

Table No- 1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 32 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2: Physical Progress Phase wise

Sr. No.	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Villages in O&M	OHT	Completed OHT
				Total RWS Villages	100%, 90% to 99%, < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages			but not RWS	Required OHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] IIFCL-JWIL (JV)	412	1047	454	52 49 353	37 89	28 70	347 888	131 306	227 586	0	412	72
2	[JJM] Larsen & Toubro Ltd	176	422	320	210 44 66	74 167	55 146	47 109	15 39	45 91	0	176	122

3	[JJM] VSA	175	769	339	82 29 228	28 74	27 73	120 622	24 93	97 423	0	287	114
4	[Jal Nigma] Sarala Project Works	132	464	460	206 25 229	132 464	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		895	2702	1573	550 147 876	271 794	110 289	514 1619	170 438	369 1103	0	875	308

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि –

(i) 239 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Single-Village Scheme Category में है, उन प्रत्येक योजनाओं को माह मार्च 2027 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(ii) मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा जो 55 नग पेयजल योजनायें (146 राजस्व ग्राम), मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 27 नग पेयजल योजनायें (73 राजस्व ग्राम) एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 28 नग पेयजल योजनायें (70 राजस्व ग्राम) ट्रॉयल एण्ड रन में है, उन्हें ओ० एण्ड एम० में ले जाने हेतु Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह सितम्बर, 2026 तक ओ०एण्ड एम० में ले जाने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

(iii) जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(IV) जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्य योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथा शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-2A: Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/ No Disruption	OHT Required OHT	Completed OHT	Financial Details (Lakh) Estimated Cost	Expenditure
				Total RWS Villages RWS(%)	100% 90% to 99 % < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	239	239 28	130 54%	41 18 71	56 56	36 36	147 147	50 50	106 106	0	236	95	64432 06	2544 969
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	40	40 35	39 98%	7 2 30	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	1208 2	112 2
Total		279	279 65	169 61%	48 20 101	96 96	36 36	147 147	50 50	106 106	0	236	95	64552 88	2556 1 89

03/08

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जन पद में 02 कैटेगरी की योजना यें है, SVS (Single Village Scheme(½ एवं MVS (Multi Village Scheme) A SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयीं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया–

S.N0	Firm Name	Scheme	Village	O&M Scheme	Village	WIP Scheme
1	M/s HFCL	130	130	15	15	115
2	M/s VSA Infra	36	36	9	9	27
3	M/s L&T	73	73	32	32	41
Total		239	239	56	56	183

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है।

(1) फर्म मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 115 जल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(ii) फर्म मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 27 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उन की कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(iii) फर्म मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा 41 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उन की कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(iv) जिन SVS पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है उन पर यथा शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(v) जिन 438 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टि फाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) को दियेगये।

Table No.-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	HFCL- JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Larsen & Toubro Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sarala Project Works[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HFCL- JWIL (JV)(JJM)	1047	16	17	31	7	627
2	Larsen & Toubro Ltd(JJM)	422	153	75	160	82	306
3	VSA(JJM)	769	49	35	85	23	534
4	Sarala Project Works(Jal Nigam)	464	444	92	188	384	0
Total		2702	662	219	464	496	1564

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिर्पोटेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण करा कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A: RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	2769	2745	1	23	99.13%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किशेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5: Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यबवेल	1055	1031	97.73
2	पम्प हाउस	1055	937	88.82
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	1055	385	36.49
4	ओवर हेड टेंक (OHT)	875	805/308	92
5	पाइप लाइन बिछाने का कार्य (कि०मी०)	11790	10593	89.85
6	सौर ऊर्जा प्लान्ट	578	409	70.76
7	घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)	517490	5E+05	98.08
9	सड़क मरम्मत का कार्य	8893	8891	99.98
10	वे गॉव जहॉ 100 प्रतिशत सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	2238	1566	69.97
11	कमीशनिंग गॉव	2238	676	30.21
12	नियमित जल आपूर्ति	2238	1113	49.73

05/08

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि–

(i) जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जार ही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

(ii) जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बना कर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

(iii) फर्म मेसर्स एच0एफ0सी0एल0, मेसर्स वी0एस0ए0 एवं मेसर्स एल0 एण्ड टी0 को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ–साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Larsen & Toubro Ltd	176	68	43	74	59	38
2	HFCL- JWIL (JV)	412	138	49	37	37	27
3	VSA	175	141	34	28	28	22
Total		763	347	126	139	124	87
	Jal Nigam	132	0	0	0	0	0
Total		895	347	126	139	124	87

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)–Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी को निर्देशित किया गया कि –

(i) जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हे Integrated कराना सुनिश्चित करें।

(ii) जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7: Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HFCL- JWIL (JV)	625	613	12	124	121	3
2	Larsen & Toubro Ltd	409	402	7	264	261	3
3	VSA	458	439	19	86	82	4
4	Sarala Project Works(Jal Nigam)	641	605	36	50	49	1
Total		2133	2059	74	524	513	11

06/08

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 135 शिकायतों का समयबद्ध तरीके सेगुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	21	21	0	100
2	Fluoride	22	22	0	100
3	JE/AES	2	2	0	100

Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड / जेई/ एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की जमीनी स्तर पर पहचान करा ले एवं अधोहस्ताक्षरी को सुचित करें।

अन्य बिन्दु –

1– जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिन स्थानों पर भूमि अभी तक अप्राप्त है, के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 06 ग्रामों में भूमि अप्राप्त है। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	फर्म का नाम
1	गाजीपुर सदर	गाजीपुर सदर	गोड़ा पेयजल योजना	मेसर्स एच0एफ0सी0एल0
2	गाजीपुर सदर	गाजीपुर सदर	सोन्हुलिया उर्फ बकुलियापुर पेयजल योजना	मेसर्स एच0एफ0सी0एल0
3	मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद	नाथनपुर पेयजल योजना	मेसर्स एच0एफ0सी0एल0
4	मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद	हनुमानगंज उर्फ कल्याणपुर (तड़वा)	मेसर्स एच0एफ0सी0एल0
5	कासिमाबाद	कासिमाबाद	महिपालपुर पेयजल योजना	मेसर्स एल0 एण्ड टी0
6	जखनियां	मनिहारी	कुंडासीपुर पेयजल योजना	मेसर्स एल0 एण्ड टी0

विशेष निर्देशः–

1– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर को निर्देश दिये जाते है कि सी0एम0 डैशबोर्ड में प्रथम श्रेणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर को निर्देश दिये जाते है कि योजनाओं में लम्बित विद्युत संयोजनों की सूचना तहसीलवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर को निर्देश दिये जाते है कि कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 को श्रमिकों की संख्या बढ़ाने एवं लक्षित पेयजल योजनाओं में कुल लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 12 नग योजनाएं पूर्ण की जा सकी है। जबकि वर्तमान में धनकी उपलब्धता होने के बावजूद कार्य न किये जाने के क्रम में नोटिस निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही यदि एक सप्ताह में वांछित प्रगति प्राप्त न होने की दशा में नोटिस निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कराते हुए जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, गाजीपुर उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उपरोक्त गठित निरीक्षण समिति को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में खारा पानी प्राप्त हुआ है उनकी विस्तृत रिपोर्ट निर्णय मैट्रिक्स के अनुसार डी०डब्ल्यू०एस०एम०की आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/ डी०डब्ल्यू०एस०एम०, गाजीपुर	मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, गाजीपुर	जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, गाजीपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांकः 2064 / D.W.S.M / कार्यालय/25 दिनांक 12/11/2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(वारा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
6. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
11. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0सी0–डी0पी0एम0यू0, डी0पी0एम0–टी0पी0आई0, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर।

08/08
