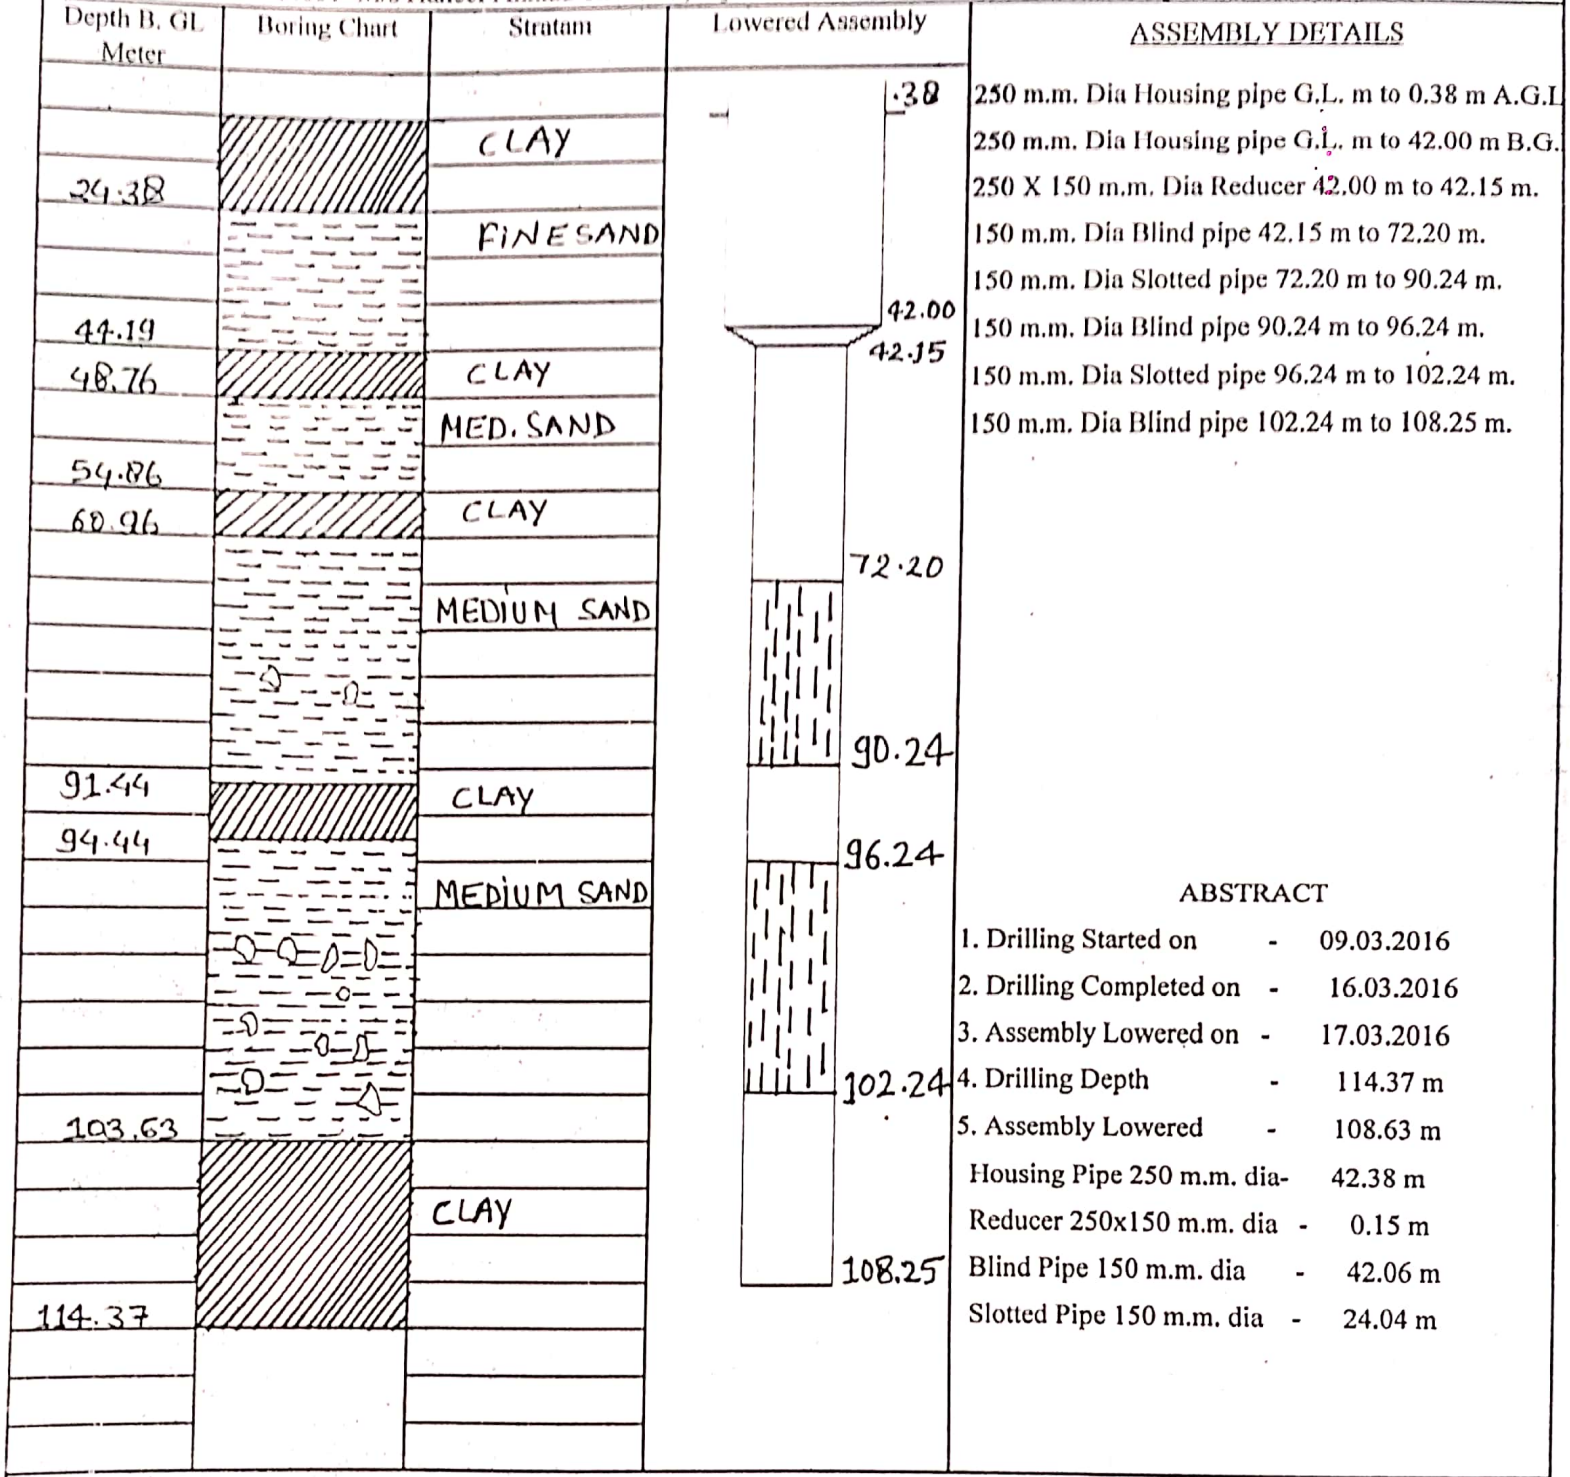

ASSEMBLY DETAILS

250 m.m. Dia Housing pipe G.L. m to 0.38 m A.G.L
250 m.m. Dia Housing pipe G.L. m to 42.00 m B.G.
250 X 150 m.m. Dia Reducer 42.00 m to 42.15 m.
150 m.m. Dia Blind pipe 42.15 m to 72.20 m.
150 m.m. Dia Slotted pipe 72.20 m to 90.24 m.
150 m.m. Dia Blind pipe 90.24 m to 96.24 m.
150 m.m. Dia Slotted pipe 96.24 m to 102.24 m.
150 m.m. Dia Blind pipe 102.24 m to 108.25 m.

ABSTRACT

1. Drilling Started on - 09.03.2016
2. Drilling Completed on - 16.03.2016
3. Assembly Lowered on - 17.03.2016
4. Drilling Depth - 114.37 m
5. Assembly Lowered - 108.63 m

Housing Pipe 250 m.m. dia- 42.38 m
Reducer 250x150 m.m. dia - 0.15 m
Blind Pipe 150 m.m. dia - 42.06 m
Slotted Pipe 150 m.m. dia - 24.04 m

As Executed

Countersigned

Scanned with OKEN Scanner
